

16. 건설과(46건)

고흥! 새로운 미래를 날다 

I. 2019 주요업무 평가

□ 주요성과

○ 살기 좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비

- 개발촉진지구 기반시설사업 추진 : 3개소 / 21,437백만원
- 고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로개설 : 2.0km / 500백만원
- 고흥만 꽃구름길 조성 : 보행로 910m, 주차장 1개소 / 1,819백만원
- 주차환경개선을 통한 공용주차장 조성 : 2식 / 1,819백만원

○ 지역 개발사업 추진으로 주민생활 편익 증대

- 주민 참여 : 304건 / 5,733백만원(완료 185건, 추진중 119건)
- 생활 민원 : 456건 / 10,430백만원(완료 255건, 추진중 201건)
- 소규모지역개발 : 444건 / 7,996백만원(완료 236건, 추진중 208건)
- 마을면민회관 신축 : 22건 / 4,794백만원(완료 - 건, 추진중 22건)
- 시설물유지관리 등 : 22건 / 2,300백만원(완료 15건, 추진중 7건)

○ 영농기반사업 확충으로 농업생산성 제고

- 국가관리 방조제 개보수사업 : 2개지구(강산, 해창만) / 2,700백만원
- 금산 신촌 배수개선사업 : 2,185백만원
- 지표수보강개발사업 : 4개지구(동강, 도화, 금산, 포두) / 3,174백만원
- 밭기반정비 : 6개지구(신봉,장수,남성,용두,청룡,장유) / 3,721백만원
- 대구획경지정리 : 3개지구(옥강, 봉덕, 남정) / 1,886백만원
- 재해위험저수지정비 : 4개지구(호동1제, 당오, 서호1제, 민등제) / 3,254백만원

○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

- SOC신규(계속) 사업 확충 : 3개지구 / 68,200백만원
- 지방도 위험도로 구조개선 : 2지구 / 2,400백만원
- 군도 및 농어촌도로 정비 : 39개지구 / 21,329백만원
- 교통약자(어린이) 보호구역 정비 : 9개지구 / 600백만원

Ⅱ. 2020년 정책방향

비전

군민 모두가 만족하는, 행복 건설 실현

목표

- 관광객 및 투자유치를 위한 인프라 구축
- 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화
- 영농기반사업 확충으로 농업 생산성 제고
- 생활밀착형 기반시설 확충

전략과제

실행계획

관광객 유입을 위한
기반시설 구축

- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통에 따른 기반시설 확충
- 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설사업
- 개발촉진지구 기반시설사업 추진

도시재생뉴딜을 통한
원도심 지역활력 제고

- 공공디자인 특화거리 조성
- 취약지역 생활여건 개선사업
- 도시재생 및 지역수요 맞춤형사업 추진

농업기반시설 확충으로
농업생산력 제고

- 밭기반 정비사업 추진
- 지표수보강 개발사업 추진
- 시군관리 수리시설 개보수사업 추진

교통환경 개선으로
군민의 삶의 질 향상

- SOC 신규(계속)사업 확충
- 해안 일주도로 전 구간 개통
- 군도 및 농어촌도로 체계적 추진

Ⅲ. 2020년 목표지표


지 표	단위	2019	⇒	2020
담수호 용수를 활용한 가뭄해결 추진	지구	3	→	3
녹동~소록도간 투명 인도교 개설	지구	1	→	1
어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대	개소	9	→	11
어린이놀이터 확대 및 개보수 추진	개소	2	→	3
고흥~봉래 국도 4차선 확포장	km	37.6	→	37.6
고흥일주 해안도로 전 구간 개통	km	4	→	9.5
금산 신양~연흥간 인도교 개설	지구	1	→	1
도화 지호~죽도 연도교 개설	지구	1	→	1
대서~두원 연륙교 개설	지구	1	→	1
도로 선형개량	지구	14	→	23
협소한 마을진입로 확포장 사업	개소	12	→	30
고흥터미널 주변 공영주차장 조성	개소	-	→	1
해창만 연결도로 확포장	km	-	→	2.7
교통·보행약자를 위한 '배려의자'설치	개소	-	→	100
도시계획구역 보도블럭 교체	식	-	→	1
요철맨홀 보수 전 읍면 확대	읍면	2	→	16
고흥읍 산책로 조성	km	-	→	2.0

지 표	단위	2019	⇒	2020
주민참여형 쌈지 주차장 설치사업	개소	-	→	10
골목길 안심등 설치사업	개소	-	→	750
마을안길 등 추락 위험지구 안전시설 설치	km	-	→	4.0
경지정리지구 내 농로 교각지점 가각부 개선	개소	-	→	100
국도 4차선 통로박스 내 조명시설 설치	개소	10	→	30
혹한기 대비 버스승강장 시설 개선 확대	개소	10	→	30
'19년 공모 선정사업 추진	개소	2	→	4
도시재생 뉴딜사업 공모	선정	-	→	1
소규모 지역개발 사업 추진	개소	1,596	→	2,315
팔영대교 복합쉼터 조성	지구	-	→	1
영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선	지구	-	→	1
고흥 봉계교차로 개선사업	지구	-	→	1
남양~우도간 인도교 설치	지구	-	→	1
건설업체 역량강화를 통한 건설산업 육성	회	1	→	2
고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설사업	km	2.0	→	2.0
개발촉진지구 기반시설사업 추진	개소	3	→	3
주차환경 개선을 위한 공영주차장 조성	개소	-	→	4
국가관리방조제 개보수(강산, 해창만)	지구	2	→	2
배수개선사업(신촌)	지구	1	→	1
지표수 보강개발사업	지구	2	→	3

IV. 분기별 주요과제 추진일정

구 분		추진과제
1/4분기	1월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 중앙부처·관계기관 업무협의 ▶ 고흥읍 공영주차장 기본계획 및 실시설계 의뢰 ▶ 건물철거 ▶ 소규모(협소안길)사업 현지조사 및 실시설계 실시 ▶ 농업생산기반사업 예산 신청
	2월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지구지정 등 행정절차 이행 ▶ 농업생산기반 시설 보조사업 보조금 확정 ▶ 신규 사업 기본 및 실시설계 용역, 계속사업 발주 ▶ 2020년 신규사업 발주
	3월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 건물철거 완료 ▶ 공사착공 ▶ 소규모사업 발주 ▶ 기본계획 및 실시설계 의뢰 ▶ 계속사업 착공, 소규모 농업생산기반 사업 발주(200건) ▶ 영농기 대비 수리시설 정비 ▶ 전남도 및 중앙부처 방문 사업반영 건의
2/4분기	4월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 저수지 물 채우기, 스피들, 분수문 정비 ▶ 주요 경작로 보수(보조기층 부설)
	5월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 용배수로 관리, 영농기 농업용수 공급 체계 유지 ▶ 행락철 저수지, 방조제, 고흥만 공원 풀베기 ▶ 기획재정부 방문, '21년 예산확보 건의
	6월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 용배수로 관리, 영농기 농업용수 공급 체계 유지 ▶ 소규모 농업기반 사업 준공(200건) ▶ 소규모 사업 준공

구 분		추진과제
3/4분기	7월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기본계획 및 실시계획 수립(고시) ▶ 공사착공 ▶ 방조제 안전점검 ▶ 배수펌프장 기계, 전기 안전점검, 가동상태 유지 ▶ 전남도 및 중앙부처 방문 사업반영 건의
	8월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 재해(태풍) 대비 저류지, 배수로 준설 ▶ 저수지, 저류지 관리 수위 조정 및 유지 ▶ 2021년 사업계획 수립
	9월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수확철 대비 주요 경작로 보수 ▶ 행락철 저수지, 방조제 풀베기
4/4분기	10월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 배수장, 양수장 기능 진단(기계, 전기, 밸브) ▶ 2021년 신규사업 실시설계
	11월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 농한기 노후 수리시설 개보수 계획 수립 ▶ '20년 주요사업 준공
	12월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 민관합동 농업기반 시설물 안전점검 ▶ 계속사업 등 중·대규모 사업 준공
연중		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 어린이놀이터 개보수 추진 ▶ 신속집행 ▶ 농업기반 시설물 유지보수

고흥! 새로운 미래를 날다 

V. 2020년 주요업무

목 차

I. 2020년 주요업무 계획	509
1. (공약) 담수호 용수를 활용한 가뭄해결 추진	513
2. (공약) 녹동~소록도간 투명 인도교 개설	514
3. (공약) 어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대 ..	515
4. (공약) 어린이놀이터 확대 및 개보수 추진	516
5. (공약) 고흥~봉래 국도 4차선 확포장	517
6. (공약) 고흥일주 해안도로 전 구간 개통	518
7. (공약) 금산 신양~연흥간 인도교 개설	519
8. (공약) 도화 지호~죽도 연도교 개설	520
9. (공약) 대서~두원 연륙교 개설	521
10. (공약) 도로 선형개량	522
11. (공약) 협소한 마을진입로 확포장 사업	523
12. (공약) 고흥터미널 주변 공용주차장 조성사업	524
13. (공약) 해창만 연결도로 확포장	525
14. (신규) 교통·보행약자를 위한 '배려의자' 설치	526
15. (신규) 도시계획구역 보도블럭 교체	527
16. (신규) 요철맨홀 보수 전 읍·면 확대	528
17. (신규) 고흥읍 산책로 조성	529
18. (신규) 주민 참여형 쌈지 주차장 설치사업	530


❖ ❖ 목 차 ❖ ❖

- 19. (신규) 골목길 안심등 설치사업 530
- 20. (신규) 마을안길 등 추락 위험지구 안전시설 설치 ... 531
- 21. (신규) 경지정리지구 내 농로 교차지점 가각부 개선 ... 532
- 22. (신규) 국도 4차선 통로박스 내 조명시설 설치 533
- 23. (신규) 혹한기 대비 버스승강장 시설 개선 확대 533
- 24. (신규) '19년 공모 선정사업 추진 534
- 25. (신규) 도시재생 뉴딜사업 공모 535
- 26. (신규) 소규모 지역개발사업 추진 536
- 27. (신규) 팔영대교 복합쉼터 조성 537
- 28. (신규) 영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선 538
- 29. (신규) 고흥 봉계교차로 개선사업 539
- 30. (신규) 남양~우도간 인도교 설치 540
- 31. (계속) 건설업체 역량 강화를 통한 건설산업 육성 ... 541
- 32. (계속) 고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설사업 542
- 33. (계속) 개발촉진지구 기반시설사업 추진 543
- 34. (계속) 주차환경 개선을 위한 공영주차장 조성 544
- 35. (계속) 국가관리방조제 개보수(강산, 해창만) 545
- 36. (계속) 배수개선사업(신촌) 546
- 37. (계속) 지표수 보강개발사업 547
- 38. (계속) 받기반 정비사업 548

☐☐ 목 차 ☐☐

39. (계속) 대구획 경지정리사업	549
40. (계속) 농촌 생활환경 정비사업	550
41. (계속) 재해 위험저수지 정비사업	551
42. (계속) 기계화경작로 확포장사업	552
43. (계속) 흙수로 구조물화사업	553
44. (계속) 지방관리방조제 개보수(월포, 일정)	554
45. (계속) 점암 지방도 843호선 곡강~우두간 확포장 ..	555
46. (기존) 군도 및 농어촌도로사업 체계적 추진	556

Ⅱ. 2020년 재정투자 계획	557
-------------------------------	------------

고흥! 새로운 미래를 날다 

1

[공약] 담수호 용수를 활용한 가뭄해결 추진

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 소요예산 : 53,759백만원(국 34,589, 지방비 19,173)
 - 기시행 : 27,424 ▪ '20년 : 9,304 ▪ '21년 이후 : 17,031
- 주요내용 : 가뭄해소 위한 양수장, 송수관로, 수계체계 개선
 - 물 부족지구 농업용수 이용체계 개편
 - 수리불안전담, 가뭄 우심지구 단계적 추진

현재까지 추진상황

- 농업용수 공급 수계체계 개선사업 기본조사 용역
- 가뭄시 용수 공급에 차질이 있는 3개 지구 수계체계 개선 완료

사업명	사업량	사업비(백만원)	비고
고흥 고소지구 송수관로	· 송수관로 2.8km	300	'19. 10.
여호간척지 송수관로	· 송수관로 1.5km	150	'19. 05.
남정지구 양수장	· 송수관로 1.5km	160	'19. 05.
신양지구 지표수보강개발	· 신양제 보강, 송수관로, 양수장	9,938	'11~'19

추진계획

- 도야들 농업용수 공급 사업(양수장, 송수관로, 준설)
 - 양수장1개소, 송수관로 1.3km : '19. 12. ~ '20. 04.
- 포두 봉덕지구 대구획 경지정리 사업(양수장, 송수관로)
 - 양수장 2개소 준공 및 가동 : '20. 3. ~ '20. 9.
- 대서 남정지구 대구획경지정리 사업(양수장, 송수관로, 용배수로)
 - 양수장1개소, 송수관로 3km : '19. 1. ~ '20. 12.
- 지표수보강개발사업 3개지구 추진(송산,동정,화천)
 - 수원공 확장, 양수장, 송수관로 매설
- 금산 신양제 유입 용수관로 매설

예산확보방안

- 지표수보강개발사업 3지구(송산, 동정, 화천), 신양제 용수관로 등 5,200백만원 확보
- 대구획경지정리(봉덕, 남정) 4,104백만원('19. 12월말 내시)

기대효과

- 안정적인 수원 확보로 가뭄 극복 및 농업 생산성 향상

2

[공약] 녹동~소록도간 투명 인도교 개설

- 위 치 : 도양읍 동두산~소록도 구 선착장
- 사업기간 : 2020. ~ 2023. 【4년】
- 소요예산 : 20,000백만원(군비)
- 주요내용 : 해상인도교 설치 500m

현재까지 추진상황

- 소록도 병원 및 주민자치회 사업 협의 : 4회
 - 소록도측, 사업 반대의견 제시

예상되는 문제점

- 소록도 병원 및 주민자치회 사업 반대로 추진 난항
 - 소록도 자치회 : 소록도는 관광지가 아니므로 인도교 설치는 시기상조
 - 국립소록도병원 : 관광목적의 사업 반대하며 향후 여건변화 시 검토

향후대책

- 사업 타당성 등을 소록도 자치회 측과 지속적 협의후 추진

예산확보방안

- 여건 변화로 사업 정상 추진될 경우 순수 군비 투입

3**[공약] 어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대**

- 사업기간 : 2018. ~ 2022. 【5년】
- 소요예산 : 1,430백만원(국비 210, 군비 1,220)
- 주요내용 : 동강중학교 보행로 확보 등 스쿨존 정비 9개소

□ 현재까지 추진상황

- 고흥동초등학교 등 8개소 스쿨존 정비 : '19. 4. ~ 9.
 - 표지판, 고원식 횡단보도, 차선정비 등 / 420백만원
 - 8개소 : 고흥동초, 녹동초, 풍양초, 금산초, 봉래초, 과역초, 남양초, 대서초
- 동강중학교 보행로 확보 : '18. 11. ~ '19. 10.
 - 보행로 설치 L=1.0km / 430백만원('18년 250, '19년 180)

□ 추진계획

- 풍양초, 봉래초 스쿨존 정비 : '20. 3.
 - 사업비 : 100백만원(군비)
 - 사업량 : 고원식 횡단보도, 어린이 보호구역 표지판 등

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보 : 100백만원

□ 기대효과

- 안전사고 위험에 노출된 어린이 보호구역 교통환경 개선
- 어린이 등하교 보행로 확보로 안전하고 편안한 교통여건 조성

4

[공약] 어린이놀이터 확대 및 개보수 추진

- 사업기간 : 2019. ~ 계속
- 소요예산 : 1,000백만원
- 주요내용 : 신설 2개소(과역, 두원), 개보수 5개소(고흥 3, 도양 2)

현재까지 추진상황

- '19. 6. : 고흥읍 봉동 물놀이기구 시설 개보수 완료
 - 물놀이기구(티핑버킷) 확충 및 바닥재 보수(석재→친환경 탄성포장)
 - 사업비 : 80백만원
- '19. 7. : 과역면 어린이놀이터 조성사업 완료
 - 사업량 : 부지조성 및 놀이기구 4종 설치
 - 사업비 : 160백만원

추진계획

- 기존놀이터 시설 개보수 요인 발생 시 즉시 정비 추진
- '20. 2. : 두원면 풍류지구 어린이놀이터 신설 국비 건의(군→국토부)
 - 지역수요 맞춤형지원사업(국비 100%)

예산확보방안

- '20년 국토교통부 신규사업비(300백만원) 반영 건의

기대효과

- 지역 어린이들의 눈높이에 맞춘 다양한 놀이 시설물 개보수로
군민 삶의 질 향상 기대

- 위 치 : 고흥호형 ~ 동일동포 ~ 봉래교동(국도15호선)
- 사업기간 : 2020.~2025. 【6년】
- 소요예산 : 282,000백만원(국비)
- 주요내용 : 4차선 확포장 L=37.6km, B=20.0m
- 시 행 청 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

현재까지 추진상황

- 국회, 기획재정부, 국토교통부, 국토연구원 방문 사업 건의 : 6회
- 국토연구원, 제5차 국도건설 5개년 계획 수립 용역 수행차 현장 확인 : '19. 5.
 - 국토연구원, 제5차 국도건설 5개년 계획 수립 용역 시행('19~'20)

추진계획

- 2019년 말 여수~고흥간 연륙·연도교 개통과 '21년 한국형 발사체 발사로 인한 관광객과 교통량 증가에 대응하기 위해 확포장 시급
 - 「제5차 국도건설 5개년계획」 수립 시 최우선 순위반영 후 예비타당성 조사 면제 대상사업에 반영될 수 있도록 국토부, 국토연구원 방문 지속 건의

예산확보방안

- 제5차 국도건설 5개년 계획('21~'25)에 최우선 순위 반영 후 국비 사업 추진

기대효과

- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통으로 유입되는 관광객과 나로도 권역을 찾는 관광객에게 교통편의 제공

6**[공약] 고흥일주 해안도로 전 구간 개통**

- 대서~도양간 지방도830·851호선 ⇨ 국도77호선 노선변경 : 119,300백만원
 - 현 노 선(내륙) : 대서(탄포)~고흥~도양(52.5km) ⇨ 기존국도
 - 변경노선(해안) : 대서(송림)~두원(대전)~도덕(용동)~도양 봉암(46.4km)
- 지방도 확포장 사업 : 3개지구 98,300백만원(도비)
 - 과역 호덕~남양 선정간(지방도843호선) : L=9.50km, 45,200백만원(착수)
 - 도양 신흥~도덕 용동간(지방도830호선) : L=8.23km, 37,900백만원(보상)
 - 대서 안남~송림간(지방도851호선) : L=3.48km, 15,200백만원(보상)

□ 현재까지 추진상황

- 대서~도양간 지방도830·851호선을 국도77호선으로 노선변경 건의 : 6회
 - 국토교통부, 국토연구원, 전라남도 방문 지속 건의
- 지방도 확포장 사업 조속 추진 건의 : 5회
 - 지방도 확포장사업 설계 완료 3개 지구(착수1, 보상2) 조속 사업 마무리 될 수 있도록 전남도 방문 건의

□ 추진계획

- 고흥~여수간 연륙·연도교와 국도77호선을 연계한 고흥반도 해안 일주 해양관광도로 개발을 위하여 국토교통부, 전남도 등에 적극 건의
- 전라남도에 지방도 확포장 사업 조속 추진 건의

□ 예산확보방안

- 대서~도양간 지방도830·851호선을 국도77호선으로 노선 변경하여 국비 사업 추진
- 지방도 확포장 사업 '20년 본예산 도비 확보

□ 기대효과

- 서남해안 일주 해안관광도로 개념에 맞게 국도77호선 노선을 변경하여 교통량 분산 및 관광자원화

7**[공약] 금산 신양~연흥간 인도교 개설**

- 위 치 : 고흥군 금산면 신양~연흥도
- 사업기간 : 2019.~2023. 【5년】
- 소요예산 : 19,000백만원(군비)
- 주요내용 : 해상인도교 설치 400m

□ 현재까지 추진상황

- 타당성 및 기본계획수립용역 완료 : '19. 4.
 - 용역비 : 50백만원

□ 예상되는 문제점

- 지방도 830호선 완도고금~고흥금산 해상교량 연계 검토 및 국도 승격 필요성이 대두되어 재검토 필요
 - 국토부 노선 조정계획에 반영하여 국도승격 추진
 - 노선 : 완도 고금~금산 연흥도~신양(해상교량 L= 10.22km / 7,607억원)
 - 전라남도, 예비타당성 면제 대상사업 지속 추진
- 타당성 및 기본계획 용역 결과, 소요사업비 과다 소요
 - 인도교 건설 국고지원사업 부재로 소요사업비 순수 군비 투입

□ 향후대책

- 지방도 830호선 완도고금~고흥금산 간 국도 승격과 해상교량 설치에 따른 예비타당성조사 면제 대상사업 반영될 수 있도록 추진
- 사업비 중복 투자 방지를 위하여 지방도 830호선 국도승격 등 사업 추이를 보면서 진행

□ 예산확보방안

- 지방도 830호선 국도승격으로 해상교량 국비사업 시행

- 위 치 : 고흥군 도화면 지죽리 죽도~목도~지호
- 사업기간 : 2020. ~ 2025. 【6년】
- 소요예산 : 48,500백만원(도비)
- 주요내용 : 교량 0.43km, 접속도로 1.62km
- 시 행 청 : 전라남도

현재까지 추진상황

- 도화 지죽~점암 대롱간 지방도855호선 기점변경(도화 지호⇨죽도)을 전라남도에 지속건의 : 5회
- 전라남도지사 우리군 방문 시 건의 : '19. 2. 22.

추진계획

- 국토부, 노선조정 계획 반영 후 '20년 지방도 기점 변경 반영 지속건의
 - 단절된 섬지역의 간선도로 기능 확보와 관광 인프라 구축 등 필요성 설명

예산확보방안

- 지방도855호선 기점변경(도화 지호⇨죽도) 반영 후 도비 확보

기대효과

- 단절된 섬 주민 삶의 질을 개선 및 다도해 절경을 감상할 수 있는 해안 일주도로 개설로 해양관광 수요 창출
- 지죽도 주산물(김, 장어 등)의 원활한 수송을 통해 지역소득 증대 기여

9**[공약] 대서~두원 연륙교 개설**

- 위 치 : 고흥군 대서면 신기~두원면 대전(지방도851호선)
- 사업기간 : 2020. ~ 2025. **【6년】**
- 소요예산 : 119,300백만원(국비)
- 주요내용 : 해상교량 1.73km
- 시 행 청 : 국토교통부

□ 현재까지 추진상황

- 대서~도양 국도77호선 노선변경 사업과 연계 추진
 - 현 노 선(내륙) : 대서(탄포)~고흥~도양(52.5km) ⇨ 기존국도
 - 변경노선(해안) : 대서(송림)~두원(대전)~도덕(용동)~도양 봉암(46.4km)
- 국회, 기획재정부, 국토교통부, 국토연구원, 전라남도 방문 사업 건의 : 4회

□ 추진계획

- 고흥~여수간 연륙·연도교와 국도77호선을 연계한 고흥반도 해안 일주 해양관광도로 개발을 위하여 국토교통부, 전라남도 등에 적극 건의

□ 예산확보방안

- 국토부, 대서~도양 국도77호선 노선변경 반영 후 해상교량 설치사업 국비 확보

□ 기대효과

- 서남해안 일주 해안관광도로 개념에 맞게 국도77호선 노선을 변경하여 교통량 분산 및 관광자원화

- 지방도 제2차('14~'23) 위험도로 구조개선 사업 : 6개지구/10,700백만원
 - 두원 학곡지구(2,000), 도화 봉룡~세동(2,500), 풍양 송정지구(1,400)
 - 점암 강산지구(1,100), 포두 상포지구(2,100), 도양 용정지구(1,600)
- 군도 및 농어촌도로 구조개선 사업 : 25개지구 / 9,700백만원
 - 군 도 : 15개지구 / 5,800백만원
 - 농어촌도로 : 10개지구 / 3,900백만원

현재까지 추진상황

- 지방도 제2차('14~'23) 위험도로 구조 개선사업
 - 지방도 : 2개지구 / 2,400백만원(두원 학곡 2,000, 도양 용정 400)
- 군도 및 농어촌도로 구조개선 사업 총체계획 수립 연차적 추진
 - 군 도 : 7개지구 / 2,300백만원
 - 농어촌도로 : 5개지구 / 1,400백만원

추진계획

- 지방도 제2차('14~'23) 위험도로 구조 개선사업
 - 지방도 : 2개지구 / 1,400백만원(풍양 송정 200, 도양 용정 1,200)
- 군도 및 농어촌도로 선형개량사업 : 7개지구 / 4,100백만원
 - 군 도 : 5개지구 / 3,500백만원
 - 농어촌도로 : 2개지구 / 600백만원

예산확보방안

- 지방도 '20년 본예산 도비 확보
- 군도 및 농어촌도로 '20년 본예산 군비 확보

기대효과

- 위험도로 구조 개선사업 시행으로 교통편익 제공과 사고예방

- 사업기간 : 2019. ~ 2021. 【3년】
- 사업규모 : 14개 읍·면 / 57개소
- 소요예산 : 5,000백만원(군비)
 - '19년 : 12개소 1,600 ▪ '20년 : 18개소 1,540 ▪ '21년 : 27개소 1,830
- 주요내용 : 협소한 마을 진입로 및 안길 확포장

현재까지 추진상황

- '19년 대상지 전수조사 : '18. 7. ~ 8.
- 현지 확인 및 연차계획 수립 : '18. 9. ~ 10.
- '19년 추진지구 및 예산반영 : '18. 11. ~ 12.
- '19년 실시설계 및 사업 발주 : '19. 1. ~ 7.

이후계획

- '20년 대상지구 및 예산반영 : '19. 11. ~ 12월 중
- '20년 대상지구 실시설계용역 : '19. 11. ~ 12월 중
- 사업 본격 추진 : '20. 3. ~ 10월 중

※ 추진방침

- '20년 대상지구 실시설계용역 사전 추진
- 우선사업 대상지 연차별 계획에 의거 추진
- 사업 신청 시 편입토지 협의 가능지구 우선 추진

예산 확보 방안

- '20년 본예산에 반영 : 18개소 1,540백만원

기대효과

- 협소한 마을 진입로·안길 확포장으로 군민의 교통안전 및 생활 편의 제공

- 위 치 : 고흥군 고흥읍 서문리 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2020. 【2년】
- 소요예산 : 5,000백만원(국비 2,000, 군비 3,000)
 - 보상금 1,500, 공사비 3,500
- 주요내용 : 주차장 조성 1개소(주차 260대)

현재까지 추진상황

- '19. 2. ~ 3. : 주차 수급실태 조사
- '19. 4. : 감정평가 완료
- '19. 1. ~ 12. : 보상완료

추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '19. 10. ~ 12.
- 착 공 : '20. 4.
- 준 공 : '21. 12.

예산확보방안

- '20년 국토부 생활SOC 및 주차환경 개선사업에 국비 1,000백만원 확보

기대효과

- 고흥읍 터미널 주변의 고질적인 주차난 해소로 지역상권 활성화
- 공용주차장 조성으로 주거환경 향상 등 정주여건 개선

- 위 치 : 포두면소재지~남촌리 송산(군도32호선)
- 주요내용 : 도로확포장 L=2.7km(2차로), 교량 2개소
- 소요예산 : 5,000백만원(군비 등)
- 사업기간 : 2020. ~ 2022. **【3년】**

현재까지 추진상황

- 재난안전 특별교부세 신청(교량) : '19. 5.
- 지역현안수요 특별교부세 신청(도로) : '19. 8.

추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '20. 3. ~ '20. 6.
- 행정절차 이행 등 : '20. 6. ~ 12.
- 사업시행 : '21. 2. ~ '22. 6.

예산 확보 방안

- '20년 본예산 확보 : 600백만원
- 재난안전 및 특별교부세 등 국·도비 확보 총력

기대효과

- 해창만간척지 영농 주 이동도로 시설 개선을 통해 도로이용객
안전사고 예방 및 영농소득 증대 기여

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 계속
- 소요예산 : 50백만원(군비) ※ 100개소
- 주요내용
 - 어르신, 장애인, 임산부 등을 위한 횡단보도 및 병원 앞 등지에 의자 설치

현 실태

- 교통·보행약자를 위한 횡단보도 및 주요병원 앞 등지에 ‘배려의자’ 설치 필요
 - 보행자 통행량이 많은 곳에 우선 설치 필요
 - 노인들이 자주찾는 병원 주변에 배려의자 설치
 - 오픈시간(08:00~09:00) 1~2시간 전부터 병원입구 길바닥에 앉아 기다리는 어르신 자주 목격됨.

앞으로 추진계획

- 관내 주요 횡단보도 등지에 설치대상지 파악 : ‘20. 1. ~ 2.
 - 고흥, 도양읍 등 주요시가지 횡단보도 및 병원 위주 전수조사
 - 횡단보도 : 신호등 및 도로표지판에 접의식 배려의자 설치
 - 인 도 : 병원 앞 도로변 안쪽으로 안정적 설치
 - ※ 만족도 조사 후 확대 설치 검토

예산확보방안

- ‘20년 본예산 50백만원(군비) 반영

기대효과

- 보행약자를 위한 휴식, 대기공간 제공으로 무단횡단 및 신호위반 방지
- 교통·보행약자를 위한 안전한 교통환경 조성

- 사업기간 : 2020.
- 대 상 지 : 고흥·도양읍 일원
- 소요예산 : 1,000백만원(군비)
- 주요내용 : 보도 침하로 인한 통행불편 해소위해 칼라아스콘으로 교체

필요성

- 개구리주차로 인한 하중발생으로 블록 국부침하가 광범위하게 발생, 보행안전 위협
- 기존 보도블럭을 칼라아스콘으로 교체 필요

앞으로 추진계획

- '19. 11. ~ 12. : 교체대상지 전수조사
- '20. 01. : 실시설계 용역
- '20. 03. : 사업 시행
- '20. 06. : 사업 준공

예산확보방안

- '20년 본예산 반영

기대효과

- 주민생활불편 해소 및 안전사고 방지

- 사업기간 : 2020.
- 소요예산 : 1,000백만원(군비)
- 주요내용 : 요철로 인한 불량맨홀 정비
- 정비실적 : 고흥읍(320개소, 160백만원), 도양읍(340개소, 170백만원)
- ※ 기 요철맨홀 보수 후 상·하수도 및 도시가스 등 각종 관로매설 및 도로포장 시 시공미흡으로 요철 재발생, 관계부서 시공지도 필요.

필요성

- 요철맨홀로 인한 차량통행 및 소음피해 발생으로 생활불편 초래
- 각종 통과차량 진동 발생에 따른 보수 필요

앞으로 추진계획

- '19. 10. ~ 11. : 보수대상지 전수조사
- '19. 12. ~ 20. 01. : 실시설계 용역
- '20. 03. : 사업 착수
- '20. 06. : 사업 준공

예산확보방안

- '20년 본예산 반영

기대효과

- 차량 통행불편 해소 및 안전사고 예방

- 사업기간 : 2020.
- 소요예산 : 1,800백만원(군비)
- 주요내용 : 산책로 조성 L=2.0km(공용버스터미널 ~ 고흥고등학교)

필요성

- 기존 보도를 활용 산책하는 주민들이 개구리 주차 차량으로 인해 보행안전 저해
- 수변을 활용한 보행에 지장이 없는 산책공간 조성으로 삶의 질 향상 도모 필요

앞으로 추진계획

- '19. 10. ~ '20. 3. : 실시설계 용역
- '20. 04. : 관련부서 협의 후 사업 착수
- '20. 10. : 사업 준공

예산확보방안

- '20년 본예산 반영

기대효과

- 주민 건강증진 및 보행안전 확보 기여

18

[신규] 주민 참여형 쌈지 주차장 설치사업

- 사업기간 : 2020.
- 소요예산 : 60백만원(10개소)
- 사업내용 : 노후 담장이나 대문을 허물어 주차장과 화단 조성
※ 서울, 인천지역 2015년부터그린파킹사업 확대시행중

필요성

- 공공주차장 조성의 한계 ▶ 많은 예산·시간 소요 (1면당 2천만원, 2년)
- 자기소유 주택 여유 공간을 주차장으로 조성하여 도로 불법주정차를 해소

앞으로 추진계획

- 내 집 앞 주차장 설치 희망가구 모집 ▶ 개소당 최대 6백만원까지 지원

예산확보방안

- '20년 본예산 반영 추진 ※ 사업 호응도에 따라 추가사업 시행

기대효과

- 좁은골목길 주택가의 주차장및 교행로 확보로 주거환경 조성

19

[신규] 골목길 안심등 설치사업

- 사업기간 : 2020.
- 소요예산 : 60백만원 (개당 8만원, 750개소 설치)
- 사업내용 : 보안등을 설치할 수 없는 골목길에 태양광 안심등 설치

필요성

- 좁고 음침한 골목길로 보안등이 필요하나 여건상 설치가 불가능한 지역
- 태양광 안심등(내구성 3년, 태양광전지)설치로 불안감 해소

앞으로 추진계획

- 골목길 조사·주민의견 청취 ('19.12.) ▶ 안심등 설치('20.03.까지)

예산확보방안

- '20년 본예산 반영 추진 ※ 성과보고 후 전 읍·면 골목길 대상 추진

기대효과

- 취약지역의 범행기회를 차단하고 주민들에게 심리적 안전감 제공

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 11.
- 소요예산 : 500백만원(군비)
- 사업량 : 안전시설물 4.0km
- 주요내용 : 마을안길 등 추락 위험지구 안전시설 설치

현 싣 태

- 마을안길 등의 안전시설 부재로 주민통행 시 추락사고 발생
 - 안전사고 발생 다빈도 지구 우선 설치
 - 마을안길이 협소하여 안전시설물 설치가 어려운 지구는 안길 확장사업과 병행 추진
- ※ 2019. 6월 점암면 OO마을 마을안길 추락사고(지게차)로 사망사고 발생

앞으로 추진계획

- 위험지구 전수 조사 및 추진계획 수립 : '20. 1. ~ 3.
- 사업 본격 추진 : '20. 5. ~ 11.

예산확보 방안

- '20년 본예산 500백만원(군비) 반영

기대효과

- 추락위험지구 안전시설물 설치로 안전사고 사전 예방
- 안전한 마을안길 조성으로 지역주민 정주여건 개선


- 사업기간 : 2020. 3. ~ 계속
- 소요예산 : 300백만원(군비)
- 주요내용
 - 경지정리지구 내 농로 교차지점 가각부 정비

□ 현 실태

- 경지정리 지구 내 폭이 협소한 농로 교차 지점 구간내 차량 및 농기계 등의 직각 회전으로 안전사고가 빈번하게 발생

□ 추진계획

- 16개읍면 경지정리 지구내 폭 3m이하 도로 교차지점 전수 조사
- 전수 조사 현지 점검 및 시급성, 통행량 등 감안 우선순위 선정
- '20년 본예산 편성 시범사업 시행 후 주민 호응도 조사 점차적으로 정비
 - '20년 본예산 편성계획 : 사업비 300백만원, 사업량 100개소
- 정비계획 평면도

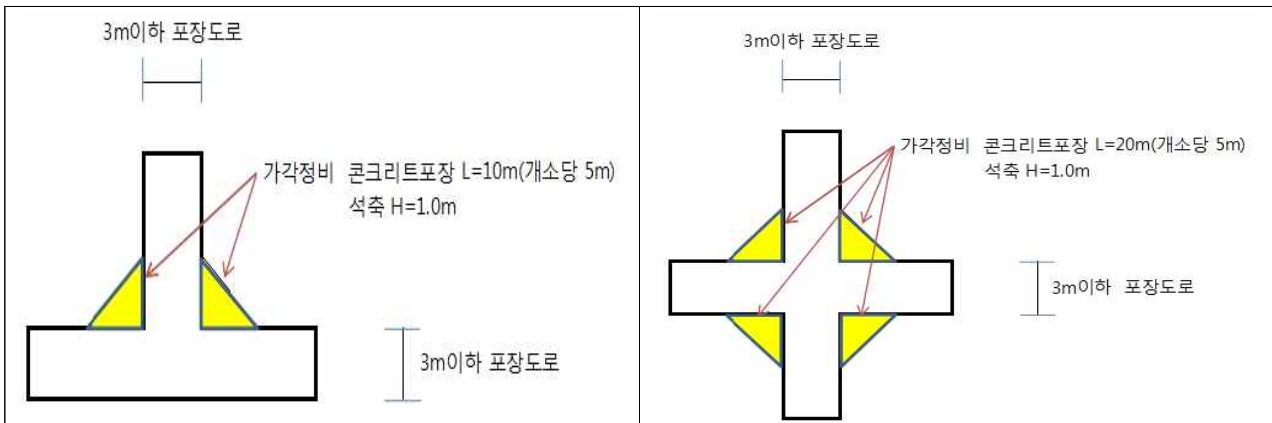

- T형 교차로(추정사업비 2,000천원/개소)

- +형 교차로(추정사업비 4,000천원/개소)

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 반영 지속 추진

□ 기대효과

- 차량, 경운기, 대형 농기계 등 농로 교차지점 원활한 통행으로 영농환경 개선과 추락사고 방지 등 안전 영농 기여

22**[신규] 국도 4차선 통로박스 내 조명시설 설치**

- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 11.
- 소요예산 : 150백만원(군비)
- 주요내용 : 국도4차선 통로박스 내 조명시설 설치
- 추진실적 (개소/백만원)
 - '19년 까지 : 10/50 ▪ '20년 : 20/100 ▪ '21년 이후: -

 필요성

- 국도4차선 통로박스 71개소 중 16개소 설치 운영중 (미설치 55개소)
- 통로박스 내 조명시설 부재로 야간 차량운행 및 통행위험
- 교통환경 개선을 위하여 교통량이 많고 다중이용 통로박스 우선 시행

 앞으로 추진계획

- 교통량이 많은 다중이용 통로박스 20개소 설치 계획

23**[신규] 흑한기 대비 버스승강장 시설 개선 확대**

- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2020. 11.
- 소요예산 : 300백만원(군비)
- 주요내용 : 온열의자 및 바람막이 설치
- 추진실적 : 온열의자(개소/백만원)
 - '19년 까지 : 10/100 ▪ '20년 : 50/200 ▪ '21년 이후: -

 필요성

- 우리군 승강장 현황 : 563개소 (다중이용 60개소)
- 고령 인구율 전국 최고인 우리군 어르신들의 대중교통 이용에 불편함이 없도록 확대 설치 필요 ※ 흑한기, 버스승강장 편의시설 제공으로 군민들 호평

 추진계획

- 학교 앞, 시장, 관공서 등 다중이용 승강장 우선 설치 및 노후 승강장 교체 시 병행 추진
 - '20년까지 바람막이 60개소, 온열의자 50개소 설치

- 사업기간 : 2020. ~ 2022. 【3년】
- 소요예산 : 8,200백만원(국비 3,900, 도비 800, 군비 3,400, 자부담 100)
- 주요내용

· 공공디자인 특화거리 조성	· 취약지역 생활여건 개선사업
· 소규모 도시재생 사업	· 지역수요 맞춤형지원사업

현재까지 추진상황

- 공공디자인 특화거리 조성 : '19. 3. 선정(도 8, 군 14)
 - 고흥읍 남계리 일원(남계어울마당 조성과 연계), 다목적 광장조성 등
- 취약지역 생활여건 개선사업 : '19. 4. 선정(국 17, 군 4, 자1)
 - 금산면 신평리 남천마을 일원, 생활·환경·안전 등 기반시설 정비 등
- 소규모 도시재생 사업 : '19. 5. 선정(국 2, 군 2)
 - 고흥읍 옥하리 일원, 흥양읍성 스토리텔링 및 옛길 복원 등
- 지역수요 맞춤형지원 사업 : '19. 7. 선정(국 20, 군 14)
 - 포두면 송산리 일원, 어린이 체험 놀이공원 조성 등

추진계획

- 지방재정투자심사, 지구지정 등 행정절차 이행 : '20. 2. 까지
- 기본계획 및 실시계획 수립 : '20. 8. 까지
- 시공 및 준공 : '22. 12. 까지

예산확보방안

- 공모사업 선정에 따른 군비 부담금 1,500백만원, '20년 본예산 확보

기대효과

- 부족한 휴게공원 확보 등 생활·환경·안전 기반시설 정비
- 우리군 역사·문화 등 지역자산을 활용한 지속 가능한 도시재생 추진

- 사업기간 : 2020. ~ 2023. 【4년】
- 소요예산 : 20,000백만원(국비 10,000, 군비 9,000, 기금 1,000)
- 주요내용 :
 - 각종 공모사업(소규모 도시재생, 도시재생 뉴딜사업 등) 유치에 최선
 - 원도심 상업지역 도시재생 모델 「고흥 살맛나는 도시 프로젝트」 발굴

현재까지 추진상황

- 정부시책에 따른 도시재생 참여기반 마련
 - 젠트리피케이션(부동산 대책) 방지 및 지역상권 상생협력에 관한 조례 제정
 - 주민협력체계(주민 프로젝트 팀), 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 등
- 주민과 함께 만드는 골목길 재생 사업 추진('20 ~'21)
 - 공공디자인특화거리('19.2) 및 소규모 도시재생('19.04) 공모사업 선정
 - 골목 환경개선(안전, 주민편의 등), 공동체 형성, 커뮤니티 공간 조성 및 활성화
 - 공영 임대상가 확보 : '19. 12.

추진계획

- 도시재생 지원센터 설립 : '20. 2.
- '20년 도시재생 뉴딜사업 공모 : '20. 5.

예산확보방안

- 도시재생 공모사업 발굴 → 선정(유치)로 국비 확보

기대효과

- 생활편의와 안정감이 확보된 도시공간 구축
- 원도심 활성화로 지역경제 발전 도모

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 16개 읍·면 / 719건
- 소요예산 : 16,540백만원(군비)
- 주요내용 : 농로 및 배수로, 마을안길, 소규모편익시설 정비 등

현재까지 추진상황

- 총 사업현황 : 1,596건 / 37,902백만원(완료 1,244, 추진중 352건)
 - 주민 참여 : 304건 5,733백만원(완료 254건, 추진중 50건)
 - 생활민원 : 692건 16,477백만원(완료 539건, 추진중 153건)
 - 소규모지역개발 : 548건 7,803백만원(완료 406건, 추진중 142건)
 - 시설물유지관리 등 : 52건 7,889백만원(완료 45건, 추진중 7건)

추진계획

- 대상사업 : 농로, 마을 진입로, 안길, 배수로, 공동 이용시설, 소규모 편익시설 등
- 대상개요 : 719건 / 16,540백만원
- 세부 추진 사항
 - 현지조사 및 실시설계 : '20. 1. ~ 2.
 - 공사 발주 및 착공 : '20. 3. ~ 5.
 - 공사 준공 : '20. 5. ~11.

예산 확보 방안

- '20년 본예산에 반영 추진

기대효과

- 농어촌지역 내 주민들의 불편을 초래하고 있는 영농시설 및 주거환경 시설물을 정비하여 주민 생활불편 최소화
- 주민 공동이용 시설물 정비로 주민생활 편익증대 및 정주여건 개선

- 사업기간 : 2019. ~ 2021. 【3년】
- 소요예산 : 3,000백만원(국비 2,000, 군비 1,000)
- 주요내용 : 34,894㎡(기반시설, 주차장, 특산품판매장, 화장실, 전망대)

□ 현재까지 추진상황

- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통대비 익산청 T/F회의 시 건의 : '19. 5.
- 복합쉼터 조성부지 토지소유자 협의(사용승락) 완료 : '19. 6.
 - 편입토지 : 영남면 우천리 산 1-1 등 3필지(34,894㎡)
- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통대비 익산청 관계기관 회의 시 건의 : '19. 7.
 - 익산청, 부지매입부터 기반시설, 편의시설물 지원
 - 고흥군, 팔영대교 야간조명시설 사업비(10억원) 지원
- 국토부, 복합쉼터조성 시범사업 추진 회의 : '19. 7.
 - 각 지방청 1개소/15억원 내외 공모사업 시행(우리군 최우선순위)
 - 익산청 : 기반시설 등 지원, - 고흥군 : 토지매입 및 유지관리

□ 추진계획

- 국토부(익산청) 복합쉼터조성 시범사업 공모 선정 : '19. 9.
- 편입토지 매입 : '19. 10. ~ 12.
- 사업시행(순천국토관리사무소) : '20. 3. ~ '21. 12.

□ 예산확보방안

- 국토부(익산청) 복합쉼터조성 시범사업 공모 선정 국비 2,000백만원 확보
- 부지매입비 군비 1,000백만원 확보

□ 기대효과

- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통으로 유입되는 관광객 편의 제공
- 여수~고흥간 해상교량의 우수한 경관 및 스토리가 있는 힐링공간 제공과 지역 농특산품 판매를 통한 소득창출

- 사업기간 : 2020. ~ 2025. 【6년】
- 소요예산 : 40,000백만원(국비)
- 주요내용 : 도로 시설개선 L=16km
- 사업주체 : 국토교통부(익산지방국토관리청)

현재까지 추진상황

- 전라남도 방문 건의 : '18. 3.
- 국토부, 국토연구원, 익산청 방문 건의 : '19. 5.
- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통대비 익산청 T/F회의 시 건의 : '19. 5.

추진계획

- 국토교통부에서 추진중인 “제5차 국도건설 5개년 계획”수립 시 최우선 순위 반영될 수 있도록 지속 방문 건의
 - 국토연구원, 제5차 국도건설 5개년 계획 수립 용역 시행('19~'20)
 - 전라남도, 국도건설 건의사업 중 최우선 순위 반영

예산확보방안

- 제5차 국도건설 5개년 계획 수립('21~'25) 시 최우선 순위 반영 후 국비사업 추진

기대효과

- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통시 유입되는 관광객에게 교통편익 제공
- 여수~영남~포두~거금도로 연결되는 국도77호선의 해안경관도로 정비

- 위 치 : 고흥군 고흥읍 남계리 봉계교차로
- 사업기간 : 2020.~2022. 【3년】
- 소요예산 : 7,000백만원(국비)
- 주요내용 : 교차로개선 1개소

현재까지 추진상황

- 국토교통부 및 기획재정부 방문 건의 : 5회
- 국회, 국토연구원 방문 건의 : 3회
- 국도 병목지점 개선사업 타당성 용역 완료(100백만원) : '19. 10.

추진계획

- 국토교통부, 국도 병목지점 개선사업 정상추진
 - 기본 및 실시설계 : '20. 3. ~ 10.
 - 사업시행 : '20. 11. ~ '22. 12.

예산확보방안

- 국토교통부 총액 포괄편성 사업비 내에서 국비 확보
 - '20년 실시설계비 확보 : 750백만원

기대효과

- 남계택지개발과 군청사 이전으로 인한 교통난 해소
- 교차로 연결로 유입·유출부 시거확보로 교통사고 사전예방

- 사업기간 : 2019.~ 2022. 【4년】
- 소요예산 : 12,000백만원(군비)
- 주요내용 : 인도교 L=1.35km
- 시행청 : 고흥군

현재까지 추진상황

- 타당성 및 기본계획 수립 용역중 : '19. 3. ~ 10.
 - 용역비 : 50백만원
- 지역주민 간담회(중산, 남양, 우도) : '19. 7.

추진계획

- 타당성 및 기본조사 용역 완료 : '19. 10.
- 어업권 피해보상 조사용역 실시 : '19. 10. ~ '21. 1.
- 주민 협의 등 : '20. 3.
- 사업시행 : '21. 3. ~ '22. 6.

예산확보방안

- '19년 제2회 추경 : 어업권 피해조사 용역비 30백만원
- 어업권 피해조사 용역결과에 의거, 사업시행 검토

기대효과

- 인도교 설치로 만조시 자유로운 육지왕래가 불가능한 우도 주민의 일상생활 불편 해소
- 가족의 섬 우도의 관광지화를 통하여 지역 소득창출 기여

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 5백만원(군비)
- 주요내용 : 건설업체 역량강화 교육 등

현재까지 추진상황

- 2019년 건설업체 관계자 역량강화 직무교육 실시
 - '19. 7. 12.(148명, 우주홀)

추진계획

- 건설업체 관계자 직무교육
 - 일 시 : '20. 7.
 - 장 소 : 고흥종합문화회관(김연수실)
 - 교육대상 : 300여명(대표자, 임원, 회계책임자 등)
 - 강 사 : 대한전문건설협회 전문강사
 - 주요내용 : 전문건설업 실질자본금, 건설산업기본법 주요 위반사례
- 전문건설업체 관계자 간담회 개최 : 연 2회

예산확보방안

- '20년 본예산에 반영 추진

기대효과

- 전문건설업체 역량강화로 안정적 기업활동 여건 조성
- 건전한 건설 산업문화 정착 및 지역경제 활성화

- 사업기간 : 2018. ~ 2021. 【4년】
- 소요예산 : 4,000백만원(국비)
- 주요내용 : 해안탐방로 2.0km(영남 우천 우두~우천마을)

현재까지 추진상황

- '17. 10. : 사업대상지 확정(국토부)
- '18. 1. ~ '19. 12. : 실시설계 용역
- '18. 9. : 주민설명회 개최
- '19. 5. : 개발계획 변경 계획서 제출(군→전남도, 익산청, 국토부)
 - 지형여건상 남진트롯박물관 연결이 불가능, 탐방로 종점 변경

추진계획

- '20. 2. : 개발계획 변경 승인(국토부) 및 사업구역 지정(전남도)
- '20. 3. : 실시계획인가(전남도)
- '20. 3. : 사업착수
 - 사업량 : 해안탐방로 1.0km
 - 사업비 : 800백만원
- '21. 12. : 사업준공

예산확보방안

- 국비 100% 확보(국토부 지역개발지원사업)

- 사업기간 : 2015. 6. ~ 2020. 12.
- 소요예산 : 21,437백만원(국비)
- 주요내용 : 개발촉진지구 내 기반시설사업 추진
- 대 상 : 3개소(도로 및 상수도 2, 공원 1)

현재까지 추진상황

사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	추진상황	공정율 (%)	비고
구암항 및 신세계리조트 기반시설	도로확포장 L=2.2km	6,000	'15. 6.~ '19. 12.	▪ 사업제척 심의중 (국토부)	-	
고흥만 수변 노을 공원조성	A=107,571㎡	10,237	'16. 5. ~ '20. 5.	▪ 토공 및 배수공 정상 추진중('20.4.준공예정)	45	
남열지구 및 우주해양리조트 기반시설	상수도 L=6.4km	5,200	'16. 5. ~ '20. 12.	▪ 민간사업 미착수로 기반시설사업 추진 불가	-	

예상되는 문제점

- 민간사업 미착수로 인한 기반시설사업 추진 지연

향후대책

- 구암항 및 신세계리조트 기반시설사업 (국토부 심의중)
 - 국가균형발전법에 의거 국비 반납 및 사업 제척('20. 3.)
- 남열지구 및 우주해양리조트 기반시설사업
 - 민간사업 착수 시 기반시설사업 발주('20년말) - 제척

예산확보방안

- 국비 100% 확보(국토부 지역개발지원사업)

- 사업기간 : 2019. ~ 2020. 【2년】
- 소요예산 : 6,700백만원(국비 2,000, 군비 4,700)
- 주요내용

사업명	옥하회관 등 3개소	도양읍 공영주차장 조성
위치	고흥읍 옥하리 268 등 5	도양읍 봉암리 2240-62
사업비	1,500백만원(군 1,500)	5,200백만원(국 2,000 군 3,200)
조성면적	1,388 m ² (60대)	주차타워 4층, 130대(4,000m ²)

현재까지 추진상황

- 토지 및 건물보상 마무리 : '19. 12.까지
 - 고흥(5필지 중 3필지), 도양(16필지 중 15필지) ▶ 보상 적극 추진

추진계획

- 기본계획 및 실시설계 : '19. 10. ~ 19. 12.
 - 도양읍 현재 진행 중 ('18. 4. ~ '19. 12.)
- 시공 및 준공 : '20. 12.까지

예산확보방안

- 생활 SOC 사업계획에 반영 ▶ '20년 국비 500백만원 확보

기대효과

- 고흥·도양읍 고질적 주차난 해소로 지역상권 활성화 및 주민 교통편의 증대로 살고싶은 도시 조성

- 사업기간 : 2016 ~ 2023
- 소요예산 : 15,743백만원(국비 15,743)
 - 강산: 7,234백만원 ▪ 해창만: 8,500백만원
- 주요내용
 - 강산지구 : 방조제개보수 1.3km, 배수갑문(7련)정비 2개소
 - 해창만지구 : 배수갑문 3개소(17련) 정비

현재까지 추진상황

지구	사업비 현황(백만원)				사업내용
	총사업비	기투자	'20년	'21년 이후	
계	15,743	7,737	2,606	5,400	
강 산	7,243	6,637	606	-	방수제 보수, 방조제 그라우팅, TM/TC
해창만	8,500	1,100	2,000	5,400	배수갑문 보수 (제1, 제3호 배수갑문 교체, 제2호 배수갑문 채도장, 구체 단면보수)

추진계획

- 강산지구 : 방수제 보수 및 그라우팅, 최종준공('20. 3.)
- 해창만지구 : 배수갑문 보수(배수갑문 제작, 설치)

예산확보방안

- '20년 국비 2,606백만('19. 12월말 내시)
 - 강산지구 606백만원, 해창만지구 2,000백만원

기대효과

- 간척지 내 해수 침투 방지로 농업 재해 예방

- 사업지구 : 금산 신촌
- 사업기간 : 2017 ~ 2020
- 소요예산 : 9,496백만원(국비 9,496)
 - 기시행 : 6,755 ▪ '20년 : 2,741
- 주요내용
 - 배수펌프장 4개소(2.4t/sec), 배수문(1@2.5*2.5) 4개소
 - 배수로(호안블럭) 2조 1.43km(1구간 0.758km, 2구간 0.672km)
 - 용수로 7조, 1.402km, 매립 80,311m³, 준설 54,416m³
 - 방수제 송상 1.851km

현재까지 추진상황

- 공사 착공 : '18. 1. 4, 공정률 52%
- 저류지 준설 54,416m³ 완료
- 간척담 매립(준설토, 순성토) 80,311m³
- 방수제 1.216km, 배수로 0.758km, 파라펫 1.08km

추진계획

- 배수로 0.672km, 용수로 1.402km
- 배수펌프장 4개소, 교량 2개소

예산확보방안

- '20년 국비 2,741백만원 신청('19. 12월말 내시)

기대효과

- 신촌들 일원 우수 신속 배제 효과로 농경지 침수 예방

- 사업기간 : 2016 ~ 2024
- 소요예산 : 20,451백만원(국비 29,421, 군비 12,610)
 - 기시행 : 3,658 ▪ '20년 : 5,000 ▪ '21년 이후 : 11,793
- 주요내용
 - 동정지구 : 제당 송상, 송수관로 2.4km, 여방수로 0.163km
 - 송산지구 : 제당 송상, 이설도로 0.88km, 용수로 8.9km, 여방수로 0.17km
 - 화천지구 : 신규지구(제당송상, 양수장, 송수관로)

현재까지 추진상황

지구명	사업비 현황(백만원)				사업내용
	총사업비	기투자	'20년	'21년 이후	
계	20,451	3,658	5,000	11,793	
금산 동정	7,151	2,129	1,500	3,522	상수관 0.6km, 오수관 06km, 제당 성토 50m, 복통
포두 송산	9,800	1,529	1,500	6,771	이설도로 0.88km, 여방수로 발파
대서 화천	3,500	-	2,000	1,500	양수장, 송수관로 3.1km

추진계획

- 동정지구 : 제당 70m, 이설도로, 사통
- 송산지구 : 제당 154m, 여수토방수로 38m, 용수지선 3.8km
- 화천지구 : 실시설계 및 시행계획 승인('20. 2.), 공사착공('20. 3.)

예산확보방안

- '20년 3개지구 사업비 5,000백만원
 - 동정 1,500백만원, 송산 1,500백만원, 화천 2,000백만원

기대효과

- 안정적인 수원 확보로 가뭄 극복 및 농업 생산성 향상

- 대상지구 : 받면적이 30ha 이상 우량지구
- 사업기간 : 2019 ~ 2020
- 소요예산 : 1,813백만원(국비 1,451, 도비 181, 군비 181)
 - 기시행 : 1,000 ▪ '20년 : 813
- 주요내용 : 용배수로, 농로포장, 수원공
 - 청룡 : 농로 1.98km, 배수로 2.4km, 수원공 1개소
 - 망동 : 기본 및 실시설계중(농로, 배수로, 수원공 등)

현재까지 추진상황

지구명	사업비 현황(백만원)				사업내용	비고
	총사업비	기투자	'20년	'21년 이후		
계	1,813	1,000	813			
도화 청룡	1,002	500	502		실시설계 : '19. 12. ~ '20. 01. 공사 착공 : '20. 02. (농로 2.1km, 배수로 3.5km)	
남양 망동	811	500	311		실시설계 : '19. 10. ~ '20. 01. 공사 착공 : '20. 02. (농로 1.9km, 배수로 2.4km)	

추진계획

- 청룡지구
 - 공사착공 : '20. 02
 - 공사 준공 : '20. 12
- 망동지구
 - 기본 및 실시설계 : '20. 1. ~ 2.
 - 공사 착공 : '20. 02.

예산확보방안

- '20년 2개지구 사업비 1,002백만원 신청('19. 12월말 내시)

기대효과

- 받기반 시설 정비로 영농여건 개선 및 농가 소득 증대

- 사업기간 : 2017~ 2021
- 소요사업비 : 9,638백만원(국비 7,105, 도비 465, 군비 2,068)
 - 기시행 : 2,515 ▪ '20년 : 4,051 ▪ '21년 이후 : 3,072
- 주요내용 : 용배수로, 농로, 펌프장
 - 포두 봉덕 : 농로 3.4km, 송수관로 3.73km, 양수장 2개소, 펌프장 1개소
 - 대서 남정 : 용수로 17.9km, 배수로 11.2km, 양수장 1

현재까지 추진상황

지구명	사업비 현황(백만원)				사업내용	비고
	총사업비	기투자	'20년	'21년 이후		
계	9,638	2,515	4,051	3,072		
포두 봉덕	4,504	2,328	2,176	-	제1양수장, 제2양수장, 송수관로 3.73km, 포장 2.73km	계속
대서 남정	5,134	187	1,875	3,072	양수장, 송수관로 2.5km	

추진계획

- 봉덕지구 : 배수펌프장 1개소, 농로 0.677km, 최종 준공 '20. 12
- 남정지구 : 양수장 1개소, 관로 2km

예산확보방안

- '20년 2개 지구 사업비 4,051백만원 신청('19. 12월말 내시)

기대효과

- 경지정리 지구 노후시설 정비로 농업 생산성 향상

- 사업기간 : 1997. ~ 2025. 【29년】
- 사업대상 : 11개면(도서, 읍지역 제외)
- 소요예산 : 39,573백만원(국비 27,701, 군비 11,872)
 - 기시행 : 14,965 ▪ '20년 : 200 ▪ '이후 : 24,408
- 주요내용 : 농로, 용배수로, 주민편익시설 등

추진현황

- 사업 시행 : 11개면
 - 기 추진 : '10(포두·두원), '11(대서), '12(영남·동강),
'13(도덕·남양), '14(점암·과역), '15(풍양·도화),
'16(도덕), '17(두원), '18(포두), '19(대서)
 - 사업비 : 14,965백만원

추진계획

- 대상지구 : 동강·영남
 - 기본 및 실시설계 : '20. 1. ~ 3.
 - 공사 착공 : '20. 4.

예산확보방안

- '20년 사업비 200백만원 신청('19. 12월말 내시)

기대효과

- 농어촌 영농기반 시설 정비로 농업생산성 증대 및 정주여건 개선

- 사업기간 : 2018 ~ 2020. 【3년】
- 총사업비 : 5,777백만원(국비 2,889, 군비 2,888)
 - 당오제 : 1,777 ▪ 서호1제 : 1,800 ▪ 민등제 : 2,200
- 주요내용
 - 당오제 : 제방 157m, 취수시설 1식, 여방수로 92m, 그라우팅 185공
 - 서호1제 : 제방 143m, 취수시설 1식, 여방수로 99m, 그라우팅 140공
 - 민등제 : 제방 178m, 취수시설 1식, 여방수로 80m, 그라우팅 200공

현재까지 추진상황

지 구 명	사업비 현황(백만원)			사 업 내 용	비 고
	총사업비	기투자	'20년		
계 3지구	5,777	3,074	1,044		
도화 당오제	1,777	1,194	583	여방수로 92m, 취수시설 1식	
대서 서호1제	1,800	1,800	-	여방수로 99m, 취수시설 1식	
과역 민등제	2,200	80	461	시행계획 승인 등 행정사항 추진	

추진계획

- 도화 당오제, 대서 서호1제
 - 영농기철 이전 1차분('19년) 조기 준공 및 2차분 착수
- 과역 민등제
 - 영농기철 이전 조기 착수

예산확보방안

- '20년 국비(50%) 522백만원 예산 내시
- 군비 부담률(50%) 522백만원 '20년 본예산 반영

기대효과

- 저수지 유실 등 재해위험 사전예방 및 안정적인 농업용수 확보

- 사업기간 : 1995. ~ 2025. 【31년】
- 사업대상 : 경지정리 117지구, 625개 노선(688km)
- 총사업비 : 70,311백만원(국비 49,218, 도비 6,328, 군비 14,765)
 - '19년까지 : 46,190 ▪ '20년 : 200 ▪ '21년 이후 : 23,921
- 주요내용 : 기계화경작로 포장 688km(포장율 65%)
 - '19년까지 : 451.68km, ▪ '20년 : 2.8km ▪ '21년 이후 : 233.52km

현재까지 추진상황(2019년 시행분)

지구명	사업비	사업비(백만원)			추진계획	비고
		국비	도비	군비		
2개지구	130	91	11	28	L=1.04km	
점암 강산지구	70	49	6	15	기계화 경작로 확포장 (L=0.57km)	
풍양 당두지구	60	42	5	13	기계화 경작로 확포장 (L=0.47km)	

추진계획

- 고흥읍 등 3개지구 시행계획 신청 및 승인 : '20. 2.
- 실시설계 완료 및 공사 착수 : '20. 3.
 - 영농기철 이전 조기 착수
- 공사 준공 : '20. 5.

예산확보방안

- '19년도 하반기 예산 확정 내시
- 군비 부담률(21%) 42백만원 '20년 본예산 반영

기대효과

- 농어촌 영농 환경개선 및 농업 기계화 촉진과 농업 경쟁력 제고 기여

- 사업기간 : 1990. ~ 2025. 【36년】
- 사업대상 : 경지정리 117지구(447.06km)
- 총사업비 : 42,471백만원(국비 33,977, 군비 8,494)
 - '19년까지 : 17,497 ▪ '20년 : 307 ▪ '21년 이후 : 24,667
- 주요내용 : 흙수로 구조물화 447.06km 정비(정비율 40%)
 - '19년까지 : 180.18km, ▪ '20년 : 1.5km ▪ '21년 이후 : 265.38km

현재까지 추진상황(2019년 시행분)

지구명	사업비	사업비(백만원)		추진계획	비고
		국비	군비		
5지구	292	234	58	L=1.38km	
고흥 고소지구	32	26	6	흙수로 구조물화 L=0.1km	
점암 강산지구	67	54	13	흙수로 구조물화 L=0.3km	
과역 도천지구	50	40	10	흙수로 구조물화 L=0.08km	
대서 화산지구	64	51	13	흙수로 구조물화 L=0.65km	
대서 남정지구	79	63	16	흙수로 구조물화 L=0.25km	

추진계획

- 포두면 등 5개지구 시행계획 신청 및 승인 : '20. 2.
- 실시설계 완료 및 공사 착수 : '20. 3.
 - 영농기철 이전 조기 착수
- 공사 준공 : '20. 5.

예산확보방안

- '19년도 하반기 예산 확정 내시
- 군비 부담률(20%) 61백만원, '20년 본예산 반영

기대효과

- 용수 및 배수 불량 구간 구조물화로 농경지 침수피해 예방 등 안전영농 기여

- 사업기간 : 2019. 8 ~ 2021. 12.
- 소요예산 : 2,973백만원(국비 1,487, 도비 446, 군비 1,040)
 - 월포 : 2,555백만원, 일정 : 418백만원
- 주요내용
 - 월포지구 : 피복석 투하 13,607㎡, 피복석 고르기 13,311㎡, 그라우팅 등
 - 일정지구 : 피복석 투하 4,278㎡, 피복석 고르기 3,933㎡, 배수문 보수

현재까지 추진상황

지구	사업비 현황(백만원)				사업내용
	총사업비	기투자	'20년	이후	
계	2,973	200	1,318	1,455	
월 포	2555	100	1,000	1,455	시행계획 승인 및 착공('19. 12)
일 정	418	100	318	-	시행계획 승인 및 착공('19. 12)

추진계획

- 월포지구 : 피복석 투하 13,607㎡, 피복석 고르기 13,311㎡ 등
- 일정지구 : 피복석 투하 4,278㎡, 피복석 고르기 3,933㎡
- 신규지구 사업신청 : '19년 방조제안전진단결과 재해등급(D) 4개소 개보수사업 대상지구 신청('20. 01)

예산확보방안

- '20년 계속지구 2개소 사업비 1,318백만원 신청('19. 12월말 내시)
- 안전진단결과 등급 낮은 4개소(금곡, 덕흥, 백석, 달도), 신규 개보수 대상지로 반영되도록 적극 건의('20. 08. 대상지 확정) -

기대효과

- 간척지 내 해수 침투 방지로 농업 재해 예방

- 위 치 : 고흥군 점암면 곡강~우두간
- 사업기간 : 2018. ~ 2021. 【4년】
- 소요예산 : 8,000백만원(도비 3,000 균비 5,000)
- 주요내용 : 도로 확포장 L=2.74km, B=9.5m

지금까지 추진상황

- 편입토지 총 72필지 중 64필지 보상 협의 완료
- 토지수용 절차 이행 : '18. 10. ~
- 사업본격 착수 : '19. 6.

추진계획

- 3차분(최종분) 시행 : '20. 2. ~ '21. 12.
 - 아스콘포장 및 교통시설물 설치 1식
- 1·2차분 준공 : '20. 12.
- 3차분 준공 : '21. 12.

예산확보방안

- '20년 도비 매칭사업비 500백만원 확보 총력

기대효과

- 고흥~여수 연륙·연도교 개통시 교통량 폭발적으로 증가 예상,
도로시설 개선으로 교통편익 제공 및 안전사고 사전예방

- 군도 정비사업 : 26개노선 268.8km
 - 포장 : 247.2km(92.0%) ⇨ 미포장 21.6km(8%)
- 농어촌도로 정비사업 : 343개노선 789.0km
 - 포장 : 288.5km(36.6%) ⇨ 미포장 500.5km(63.4%)

지금까지 추진상황

- 군도 및 농어촌도로 건설 관리계획 수립 용역 : '19. 4. ~ '20. 2.
- '19년 사업시행 : 39지구 21,329백만원
 - 도로확포장 11지구 4,980백만원, 선형개량 13지구 4,200백만원,
재포장, 교통여건개선 15지구 12,419백만원

추진계획 : 37지구 15,053백만원

- 군도 정비 : 17지구 9,580백만원
- 농어촌도로 정비 : 20지구 5,473백만원
 - 확포장, 선형개량, 재포장, 교통안전시설물 설치 등
 - 도로정비 중장기 정비계획에 의거 연차적 추진

예산확보방안

- 도로정비 사업비 15,053백만원 '20년 본예산 확보
- 특교세 등 국·도비 확보 총력

기대효과

- 도로이용객에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

2020 재 정 투 자 계 획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	기투자	2020년 소요예산					2020년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기 타 (용자담)		
합 계	1,238,357	199,687	86,642	26,024	8,044	52,524	50	952,028	
공약사항	797,989	38,764	22,344	6,478	6,685	9,181	-	736,881	
•담수호를 활용한 가뭄해결 추진	53,759	27,424	9,304	6,178	285	2,841	-	17,031	
•녹동~소록도간 투명 인도교 개설	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
•어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨 존 확대	1,430	850	100	-	-	100	-	480	
•어린이 놀이터 확대 및 개보수 지원	1,000	240	300	300	-	-	-	460	
•고흥~봉래 국도 4차선 확포장	282,000	-	-	-	-	-	-	282,000	
•고흥일주 해안도로 전 구간 개통	217,600	1,000	5,000	-	5,000	-	-	211,600	
•금산 신양-연흥간 인도교 개설	19,000	50	-	-	-	-	-	18,950	
•도화 지호~죽도 연도교 개설	48,500	-	-	-	-	-	-	48,500	
•대서 ~ 두원 연륙교 개설	119,300	-	-	-	-	-	-	119,300	
•도로 선형개량	20,400	6,100	5,500	-	1,400	4,100	-	8,800	
•협소한 마을진입로 확 포 장 사 업	5,000	1,600	1,540	-	-	1,540	-	1,860	
•고흥터미널 주변 공용주차장 조성	5,000	1,500	-	-	-	-	-	3,500	
•해창만 연결도로 확 포 장	5,000	-	600	-	-	600	-	4,400	
신규시책	111,960	1,330	27,460	3,800	400	23,210	50	83,170	
•교통·보행약자를 위한 '배려의자' 설치	50	-	50	-	-	50	-	-	
•도시계획구역 보도 블럭 교체	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	
•요철맨홀 보수 전 읍·면 확대	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	

사업명	총사업비	기투자	2020년 소요예산					2020년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (용자담)		
• 고흥읍 산책로 조성	1,800	-	1,800	-	-	1,800	-	-	
• 주민참여형 쌈지 주차장 설치사업	60	-	60	-	-	60	-	-	
• 골목길 안심등 설치사업	60	-	60	-	-	60	-	-	
• 마을안길 등 추락 위험지구 안전시설 설치	500	-	500	-	-	500	-	-	
• 경지정리지구 내 농로 교차점 가꾸부 개선	300	-	300	-	-	300	-	-	
• 국도4차선내 통로 박스 조명시설 설치	150	50	100	-	-	100	-	-	
• 흑한기 대비 버스 승강장 시설 개선	300	100	200	-	-	200	-	-	
• '19년 공모 선정 사업 추진	8,200	-	3,150	1,200	400	1,500	50	5,050	
• 도시재생 뉴딜 사업 공모	20,000	-	200	100	-	100	-	19,800	
• 소규모 지역개발 사업 추진	16,540	-	16,540	-	-	16,540	-	-	
• 팔영대교 복합쉼터 조성	3,000	1,000	2,000	2,000	-	-	-	-	
• 영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
• 고흥 봉계교차로 개선사업	7,000	100	500	500	-	-	-	6,400	
• 남양~우도간 인도교 설치	12,000	80	-	-	-	-	-	11,920	
계속사업	258,408	138,264	21,785	15,746	959	5,080	-	98,359	
• 건설업체 역량강화를 통한 건설산업 육성	25	5	5	-	-	5	-	15	
• 고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설	4,000	1,231	800	800	-	-	-	1,969	
• 개발촉진지구 기반시설	21,437	21,437	-	-	-	-	-	-	
• 주차환경 개선을 위한 공영주차장 조성	6,700	4,500	2,200	500	-	1,700	-	-	
• 국가관리방조제 개보수	15,743	7,737	2,606	2,606	-	-	-	5,400	
• 배수개선사업 (신촌지구)	9,496	6,755	2,741	2,741	-	-	-	-	

사업명	총사업비	기투자	2020년 소요예산					2020년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (용자담)		
•지표수 보강개발 사업	20,451	3,658	5,000	3,500	-	1,500	-	11,793	
•밭기반 정비사업	1,813	1,000	813	651	81	81	-	-	
•대구획 경지정리	9,638	2,515	4,051	3,241	162	648	-	3,072	
•농촌 생활환경 정비사업	39,573	14,965	200	140	-	60	-	24,408	
•재해 위험저수지 정비사업	5,777	3,074	1,044	522	-	522	-	1,659	
•기계화경작로 확포장사업	70,311	46,190	200	140	18	42	-	23,921	
•흙수로 구조물화 사업	42,471	17,497	307	246	-	61	-	24,667	
•지방관리방조제 개보수	2,973	200	1,318	659	198	461	-	1,455	
•점암 지방도 843호선 곡강~우두간 확포장	8,000	7,500	500	-	500	-	-	-	
기존시책	70,000	21,329	15,053	-	-	15,053	-	33,618	
•군도 및 농어촌 도로 체계적 추진	70,000	21,329	15,053	-	-	15,053	-	33,618	
			이	하	빈	칸			
