

17. 건설과

I. 2021 주요업무 평가

□ 주요성과

○ 살기 좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비

- 고흥읍 유희부지 주차장 조성: 4개소 114면 / 1,115백만원
- 고흥만 수변노을공원 조성: 1개소 / 10,237백만원
- 고흥읍 산책로조성: 1개소 / 7,000백만원
- 고흥·도양읍 군계획도로 확포장: 2개소 / 3,197백만원
- '21년 공모 선정사업 추진: 3개사업 / 11,800백만원
- 어린이놀이터 확대 및 개보수 추진: 5개소 / 4,100백만원
- 고흥시가지 간판개선사업 추진: 202개소 / 555백만원

○ 지역개발사업 추진으로 주민생활 편익 증대

- 주민 참여: 304건 / 5,419백만원
- 생활 민원: 423건 / 11,820백만원
- 소규모지역개발: 423건 / 5,757백만원
- 민간자본보조사업: 12건 / 2,400백만원
- 진입로 확포장사업 등: 31건 / 3,655백만원

○ 안전한 영농환경 조성을 위한 농업기반시설 정비

- 국가관리 방조제 개보수사업 추진: 1개지구(해창만) / 8,500백만원
- 지방관리 방조제 개보수사업 추진: 8개지구 / 14,644백만원
- 재해위험저수지 정비사업 추진: 3개지구(민등, 당오, 세동) / 5,022백만원
- 담수호 용수를 활용한 가뭄해결 추진: 13개지구
- 기계화 경작로 확포장사업 추진: 12개지구 / 300백만원
- 대구획 경지정리사업 추진: 3개지구 / 11,942백만원

○ 교통환경 개선으로 군민의 삶의 질 향상

- 고흥~완도 지방도830호선 국도 27호선 승격
 - L=42.4km, 2차로, 9,008억 원(해상교량 10.2km, 접속도로 17.2km 등)
- 영남 우두~포두 옥강 국도77호선 시설개선사업 「제5차 국도·국지도 건설계획」 반영
 - 2차로 시설개선 L=14.0km, 691억원
- 고흥 봉계교차로 개선사업 시행
 - 교차로(램프 4개소) 개선 1식 / 6,760백만원
- 위험도로 선형개량사업 추진: 5개 지구/4,940백만원
- 군도 및 농어촌도로사업 추진: 46개지구/5,842백만원
- 어린이 보호구역 정비 추진: 15개소/1,225백만원

□ 아쉬운 점

- 도로 개설구간 편입토지 손실보상 미협의로 사업 지연
- 신규사업 추진 시 다수 주민 참여와 충분한 주민의견 수렴 필요
- 재난·재해 발생시 공공시설물의 신속한 복구를 위한 군·읍면간 대응체계 개선 필요
- 국비 소액지원으로 대규모 공사 공정 지연

□ 향후과제

- 중앙단위 대규모 공모사업과 병행, 주민편의 도모를 위한 소규모 공모사업 추진에도 만전
- 도로 확·포장 등 신규사업 시 기공승락 동의지구 우선 사업 시행
- 군도 및 농어촌도로 정비 중장기계획에 의거 체계적 추진
- 국비지원 확대 건의를 통한 각종 공사 조기완료 추진

Ⅱ. 2022년 정책방향

비전

삶의 질 향상을 위한, 행복 고흥 건설

목표

- 살기좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비
- 도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선
- 안정적 영농환경 구축
- 생활밀착형 기반시설 확충

전략과제

실행계획

편리하고 살기좋은
도시기반 구축

- 군관리계획(재정비) 수립
- 공영 및 유희부지 주차장 조성사업 추진
- 공원 등 군민편의시설 증대
- 고흥읍 산책로 조성
- 개발촉진지구 내 기반시설사업 추진

구도심과 노후 주거지
생활 여건 개선

- 도시재생 뉴딜사업 추진
- 취약지역 생활여건 개선사업
- 주요시가지 간판개선사업 및 노후 건축물 철거

안정 영농을 위한
기반시설 정비

- 밭기반 정비사업 및 지표수 보강개발사업 추진
- 방조제 개보수 및 배수개선사업 추진
- 기계화 경작로 확포장 및 흙수로 구조물화 사업
- 재해위험 저수지 등 정비사업 추진

교통환경 개선으로
군민의 삶의 질 향상

- SOC 신규(계속)사업 확충
- 해안 일주도로 전 구간 개통
- 군도 및 농어촌도로 체계적 추진
- 교통약자 보호구역 확충

Ⅲ. 2022년 목표지표

지 표	단위	2021	⇒	2022
보행자 안전구역 설치사업	개소	-	→	10
드론특화 지식산업센터 진입로 개설	km	3.8	→	3.8
배수개선 사업	개소	1	→	1
소규모 배수개선 사업	개소	-	→	1
대구획경지정리(포두 남성)	개소	-	→	1
염분농도 자동계측기 설치	개소	-	→	30
어린이놀이터 확대 및 개보수 추진	개소	1	→	1
고흥터미널 주변 공영주차장 조성	개소	1	→	1
어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대	지구	8	→	10
고흥~봉래 국도4차선 확포장	km	23.6	→	23.6
고흥일주 해안도로 전 구간 개통	지구	3	→	3
금산 신양~연흥간 인도교 개설	지구	1	→	1
도화 지호~죽도 연도교 개설	지구	1	→	1
대서~두원 연륙교 개설	지구	1	→	1
도로 선형개량	지구	30	→	30
고흥 군관리계획(재정비) 수립	식	1	→	1
고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설사업	km	1.0	→	1.9
유휴부지 주차장 조성사업 추진	개소	4	→	6
공원등 군민편의시설 조성	개소	1	→	2
도시재생 뉴딜사업 추진	개소	1	→	1
취약지역 생활여건 개선사업	지구	5	→	5

지 표	단위	2021	⇒	2022
도양 구도심 공영주차장 조성	개소	1	→	1
남계어울마당 및 공공디자인 특화거리 조성사업	m	239	→	239
국가관리 방조제 개보수	지구	1	→	1
지방관리 방조제 개보수	지구	2	→	5
지표수 보강개발사업	지구	3	→	3
발기반 정비사업	지구	2	→	1
재해위험저수지 정비사업	지구	3	→	3
시군관리 수리시설 개보수사업	지구	4	→	7
기계화경작로 확포장사업	km	1.6	→	2.5
흙수로 구조물화사업	km	1.7	→	2.0
팔영대교 스마트 복합쉼터 조성	지구	1	→	1
고흥 봉계교차로 개선사업	지구	1	→	1
남양~우도간 인도교 설치	지구	1	→	1
군도 및 농어촌도로사업 체계적 추진	지구	21	→	25
지역건설업체 역량 강화	회	1	→	1
마을안길 및 농로 교통 확충을 위한 가각부 정비사업	개소	37	→	45
마을 쉼터 유지 보수사업 추진	개소	49	→	55
소규모 지역개발사업 추진	개소	1,193	→	994
혹한기 대비 버스승강장 시설 개선 확대	개소	35	→	50
영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선	km	14	→	14

IV. 분기별 주요과제 추진일정

구 분		추진과제
1/4분기	1월	<ul style="list-style-type: none"> ▶해창만 꼬맹이들 테마놀이터 착공 ▶농업생산기반사업 예산 신청 ▶소규모 지역개발사업 현지 조사 및 실시설계 실시 ▶신규시책 대상지 선정 및 사업계획 수립
	2월	<ul style="list-style-type: none"> ▶농업생산기반시설 보조사업 보조금 확정 ▶신규사업 기본 및 실시설계 용역, 계속사업 발주
	3월	<ul style="list-style-type: none"> ▶군관리계획 재정비(안) 주민의견 수렴 ▶고흥터미널 주변 공영주차장 조성 준공 ▶도양 구도심 공영주차장 조성 준공 ▶영농기 대비 수리시설 정비 ▶소규모 지역개발사업 발주 ▶군도 및 농어촌도로사업 발주
2/4분기	4월	<ul style="list-style-type: none"> ▶저수지 물 채우기, 스피들, 분수문 정비 ▶주요 경작로 보수(보조기층 부설)
	5월	<ul style="list-style-type: none"> ▶용배수로 관리, 영농기 농업용수 공급 체계 유지 ▶행락철 저수지, 방조제, 고흥만 공원 풀베기
	6월	<ul style="list-style-type: none"> ▶용배수로 관리, 영농기 농업용수 공급 체계 유지 ▶소규모 농업기반 사업 준공 ▶폭염대비, 군민안전망 확충 ▶팔영대교 스마트 복합쉼터 건축공사 준공

구 분		추진과제
3/4분기	7월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '23 사업계획 수립 ▶ 방조제 안전점검 ▶ 배수펌프장 기계, 전기 안전점검, 가동상태 유지
	8월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 재해(태풍) 대비 저류지, 배수로 준설 ▶ 저수지, 저류지 관리 수위 조정 및 유지
	9월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 행락철 저수지, 방조제 풀베기 ▶ 수확철 대비 주요 경작로 보수
4/4분기	10월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 배수장, 양수장 기능 진단(기계, 전기, 밸브) ▶ '23년 신규사업 실시설계
	11월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 건설업체 관계자 교육 ▶ 농한기 노후 수리시설 개보수 계획 수립 ▶ '22년 주요사업 준공 ▶ 혹한기 대비 군민안전망 확충
	12월	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해창만 꼬맹이들 테마놀이터 준공 ▶ 남계어울림마당 준공 ▶ 계속사업 등 중·대규모 사업 준공
연중		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신속집행 ▶ 각종 시설물 유지보수

V. 2022년 주요업무

☐☐ 목 차 ☐☐

I. 2022년 주요업무 계획	502
1. (신규) 보행자 안전구역 설치사업	502
2. (신규) 드론평화 지식산업센터 진입도로 개선	503
3. (신규) 배수개선 사업	504
4. (신규) 소규모 배수개선 사업	505
5. (신규) 대구획경지정리(포두 남성)	506
6. (신규) 염분농도 자동계측기 설치	507
7. (공약) 어린이놀이터 확대 및 개보수 추진	508
8. (공약) 고흥터미널 주변 공영주차장 조성	509
9. (공약) 어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대 ...	510
10. (공약) 고흥~봉래 국도4차선 확포장	511
11. (공약) 고흥일주 해안도로 전 구간 개통	512
12. (공약) 금산 신양~연흥간 인도교 개설	513
13. (공약) 도화 지호~죽도 연도교 개설	514
14. (공약) 대서~두원 연륙교 개설	515
15. (공약) 도로 선형개량	516
16. (계속) 고흥 군관리계획(재정비) 수립	517
17. (계속) 고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설사업...	518
18. (계속) 유희부지 주차장 조성사업 추진	519
19. (계속) 공원 등 군민 편의시설 조성	520
20. (계속) 도시재생 뉴딜사업 추진	521

21. (계속) 취약지역 생활여건 개선사업	522
22. (계속) 도양 구도심 공영주차장 조성	523
23. (계속) 남계어울마당 및 공공디자인 특화거리 조성사업...	524
24. (계속) 국가관리 방조제 개보수	525
25. (계속) 지방관리 방조제 개보수	526
26. (계속) 지표수 보강개발사업	527
27. (계속) 받기반 정비사업	528
28. (계속) 재해위험저수지 정비사업	529
29. (계속) 시군관리 수리시설 개보수사업	530
30. (계속) 기계화경작로 확포장사업	532
31. (계속) 흙수로 구조물화사업	533
32. (계속) 팔영대교 스마트 복합쉼터 조성	534
33. (계속) 고흥 봉계교차로 개선사업	535
34. (계속) 남양~우도간 인도교 설치	536
35. (계속) 군도 및 농어촌도로사업 체계적 추진	537
36. (기존) 지역 건설업체 역량 강화	537
37. (기존) 마을안길 및 농로 교통 확충을 위한 가각부 정비사업...	538
38. (기존) 마을 쉼터 유지 보수사업 추진	539
39. (기존) 소규모 지역개발사업 추진	539
40. (기존) 영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선	540
41. (기존) 혹한기 대비 버스승강장 시설 개선 확대	541

II. 2022년 재정투자 계획 542

1

[신규] 보행자 안전구역 설치사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 10.
- 소요예산 : 200백만원(군비)
- 주요내용 : 교통사고 위험지역 보행자 안전구역 설치
 - 과속방지턱, 속도저감표지판, 미끄럼방지포장 등

□ 추진계획

- 수요조사 및 대상지 선정 : '22. 1. ~ 2.
 - 교통량이 많고 사고위험이 높은 지역 우선정비 시행
- 실시설계 : '22. 2.
- 사업시행 : '22. 3. ~ 10.
 - 사업량 : 보행자 안전구역 설치 10개소


□ 예산확보방안

- '22년도 본예산 편성, 200백만원(군비)

□ 기대효과

- 마을 앞 진출입로 등에서 과속차량으로 인한 교통사고 예방 및 보행자 보호를 위한 안전시설 강화로 주민 정주여건 개선

□ 설치예시

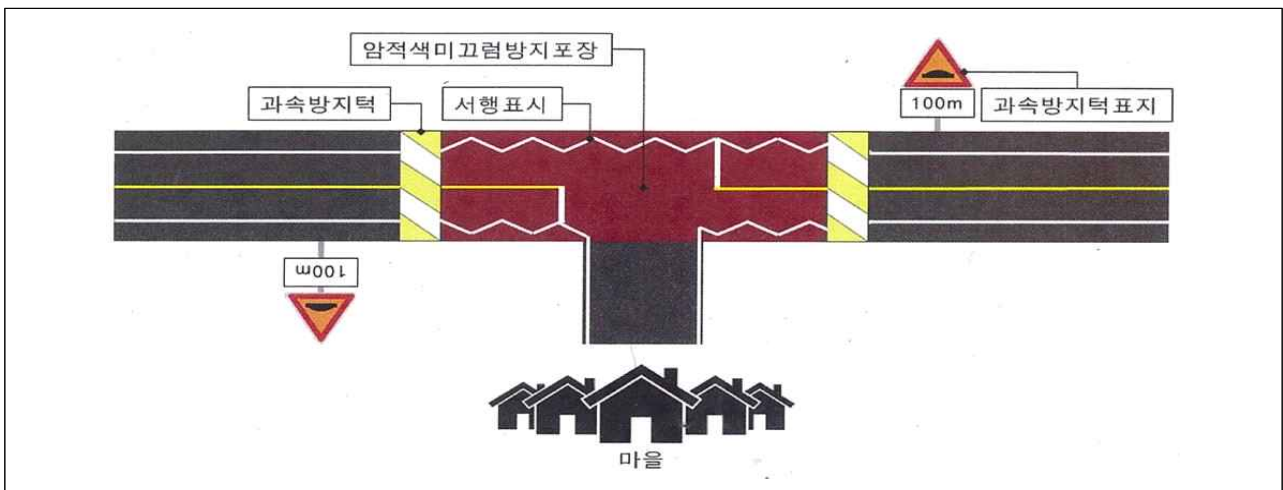

2

[신규] 드론평화 지식산업센터 진입도로 개선

- 위치 : 고흥읍 성촌리 ~ 호동리 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 6.
- 소요예산 : 5,800백만원(군비)
- 주요내용 : 도로선형개선 및 확포장 L=3.8km, B=10.0m

□ 필요성

- 드론산업 활성화 및 관련 드론기업 유치를 위한 기반시설 확충
 - 상주인구 : 600여명(유동인구 1,700명/일)
- 기존 노선 노폭협소 및 굴곡이 심하여 잦은 교통사고 발생
- 드론산업 시설확충에 따른 교통량 증가 대응 및 교통사고 예방을 위해 진입도로 개선 필수

□ 추진계획

- 실시설계 : '21. 4. ~ 12.
- 기공승락서 징구 및 행정절차 이행 : '21. 11. ~ '22. 1.
- 사업시행 : '22. 2. ~ '23. 6.

□ 예산확보방안

- '22년도 본예산 편성, 2,000백만원(군비)

□ 기대효과

- 드론산업 시설확충에 따른 교통량 증가 대응 및 교통사고 예방

3

[신규] 배수개선 사업

- 사업지구 : 점암 강산지구
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년 【3년】
- 소요예산 : 5,900백만원(국비 5,900)
- 주요내용 : 배수장 2개소, 용배수로 9.0km, 매립 52.2ha, 준설 39ha

현재까지 추진상황

- 배수개선사업 기본계획 대상지구 제출 : '20. 12월
- 배수개선사업 기본조사 대상지구 선정 : '21. 04월

추진계획

- 신규 착수 지구 선정 : '22. 03.
- 실시설계 용역 시행 : '22. 04. ~ 07.
- 시행계획 승인(도, 농림축산식품부) : '22. 08.
- 사업 착공 : '22. 09.

예산확보방안

- 국비보조사업 '22년도 국비 100백만원 확보 추진

기대효과

- 경지정리 지구 노후시설 정비 및 양·배수 시설 확충을 통한
영농 추진 원활 도모

4

[신규] 소규모 배수개선 사업

- 사업지구 : 점암 만화지구
- 사업기간 : 2022 ~ 2023년 【2년】
- 소요예산 : 1,000백만원(도비 800, 군비 200)
- 주요내용 : 배수장 1개소, 배수로 3.5km

현재까지 추진상황

- 소규모 배수개선사업 대상지 제출 : '21. 01월

추진계획

- 기본 및 실시설계 : '22. 01. ~ 06.
- 시행계획 승인(도) : '22. 07.
- 사업 착공 : '22. 08.

예산확보방안

- 군특 지방(도)이양사업 '22년도 군특예산 80백만원 확정,
군비 20백만원 확보 추진

기대효과

- 경지정리 지구 노후시설 정비 및 양·배수 시설 확충을 통한 영농
추진 원활 도모

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년 【3년】
- 소요예산 : 1,540백만원(도비 1,230, 지방비 310)
- 주요내용 : 용배수로 정비 4.8km
 - 용수로 2조 2.0km, 배수로 8조 2.8km

현재까지 추진상황

- 대구혁 경지정리사업 예정지 보고서 제출 : '21. 03월
 - 위 치 : 포두면 남성리 일원
 - 수혜면적 : 60ha
 - 시 행 자 : 한국농어촌공사 고흥지사

추진계획

- 기본 및 실시설계 : '22. 01. ~ 06.
- 시행계획 승인(도) : '22. 07.
- 사업 착공 : '22. 08.

예산확보방안

- 군특 지방(도)이양사업 '22년도 군특예산 80백만원 확정,
군비 20백만원 확보 추진

기대효과

- 경지정리 지구 노후시설 정비 및 양·배수 시설 확충을 통한
영농 추진 원활

6

[신규] 염분농도 자동계측기 설치

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 4.
- 소요예산: 510백만원(군비)
- 주요내용: 담수호 활용 양수장 취수부 자동계측 및 경보시스템 구축
 - 양수장↔군 상황실 전산연계, 염분농도 수시 확인가능

□ 추진계획

- 필요성: 이양기 소강우시 담수호 염농도 상승, 이양일정 조율 위해 시스템 구축 필요
- 실시설계: '22. 1.
- 사업시행: '22. 1. ~ 2.
 - 사업량 : 30개소
(해창만 24, 도덕 신양 1, 점암 여호 1, 과역 도야 1, 동강 죽암 1, 대서 남정 2)
 - 주요내용 : 양수장 관리인들에게 염도측정결과 실시간 전송 시스템
 - 스마트폰 및 컴퓨터를 이용, 실시간 원격 감시
 - 정확한 계측을 위한 센서부 자동 세척기능
 - 측정값 적산, 보고서 출력, 설정값 초과시 경보(휴대폰, 경광등)
 - ※ 이상염도 측정 시 이해관계인에 문자 전송 등 홍보 조치

□ 예산확보방안

- '22년도 본예산 510백만원(군비) 확보, 추진

□ 기대효과

- 담수로 염농도 수시 확인, 경작자등에 정보제공, 안정적인 물공급으로 영농추진 원활 도모

- 사업기간: 2019. ~ 계속
- 소요예산: 4,300백만원(국비 2,000 지방비 2,300)
 - 해창만 꼬맹이들 테마놀이터: 3,600백만원(국비 2,000 지방비 1,600)
- 주요내용: 기존 7개소(고흥4, 도양 2, 과역1), 신설1개소(포두)

현재까지 추진상황

- 고흥읍 봉동 물놀이시설 개보수 완료: '19. 6.
- 과역면 어린이놀이터 조성사업 완료: '19. 7.
- 지역수요 맞춤형 지원사업 선정(해창만 꼬맹이들 테마놀이터): '19. 7. 2.
 - 공모 선정사업 지정조건 이행사항 제출: '19. 8. 23.
 - 컨설팅 위원 서면·현장 컨설팅 진행: '19. 9. 10.~10. 4.
 - 컨설팅 결과에 따른 사업대상지 위치 변경: '19. 12. 23.
 - 디자인 및 실시설계 용역 발주: '20. 11. 09.
 - 지역개발조정위원회 지구지정 승인: '21. 03. 14.

추진계획

- 군계획시설 결정 고시: '21. 9.
- 지역개발사업 시행자 지정 및 실시계획 승인: '21. 10.
- 사업 발주: '21. 11.
- 사업 착공: '21. 12.
- 기존놀이터 시설 개보수 요인 발생 시 수시 정비 추진

예산확보방안

- '22년 본예산에 2,642백만원(국 1,560 군1,082)반영

기대효과

- 가족친화적인 공간조성과 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 놀이 시설물 설치로 주민 삶의 질 향상 기대

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 3. **【3년】**
- 소요예산: 5,000백만원(국비 2,000, 군비 3,000)
- 주요내용: 고흥터미널 주변 주차환경 개선
 - 주차면수 126대(건축면적 1,218㎡, 연면적 3,654㎡)

현재까지 추진상황

- 고흥 터미널주변 주차수급 실태조사 완료: '19. 1. 15. ~ 4. 8.
- 편입부지 확보(고흥읍 서문리 236-10번지 외 4필지): '19. 1. 23. ~ '20. 5.
- 고흥 터미널주변 주차장 기본계획 수립: '19. 11. 12. ~ '20. 5. 27.
- 고흥 터미널주변 주차장 실시설계: '19. 11. 26. ~ '21. 1.
 - 주차타워 특정(특허)공법 선정: '20. 2. 12.
 - 주차환경 개선사업에 반영 국비확보(2,000백만원): '20. 2.
 - 전라남도 경관·디자인 심의 조건부 승인: '20. 6.
 - 장애물없는 생활 환경(BF) 예비 인증 승인: '20. 11. 11.
- 사업 착공: '21. 3.

추진계획

- 사업 준공: '22. 3.

예산확보방안

- '21년 본예산 기확보

기대효과

- 버스터미널 주변 상습 주정차로 인한 교통체증 해소 및 깨끗한 거리환경 조성

- 위 치: 어린이 안전사고 다발구간
- 사업기간: 2018. ~ 2022. 【5년】
- 소요예산: 3,969백만원(국비 1,230, 도비 64, 군비 2,675)
- 주요내용: 어린이보호구역 정비 1식

현재까지 추진상황

- '18년 : 고흥동초 등 8개소 시설개선(420백만원)
- '19년 : 동강중학교~면소재지 보행로 설치(430백만원)
- '20년 : 풍양·봉래초 어린이보호구역 정비, 도덕초 진입로(스쿨존) 확포장,
고흥동초 등 8개소 과속카메라 설치 및 시설개선(1,394백만원)
- '21년 : 스쿨존 신호기 및 과속카메라 설치(1,225백만원)
 - 과속카메라: 풍양초, 도덕초, 점암초, 동강초, 도화초, 금산초, 봉래초
 - 신호기 : 풍남초, 도덕초, 포두초, 도화초, 녹동초, 점암초, 동강초

추진계획

- 포두초 등 10개소 스쿨존 안전시설 정비(500백만원)
- 민관합동 어린이보호구역 점검결과에 의거 연차적 추진

예산확보방안

- '22년 본예산 편성, 500백만원(군비)

기대효과

- 안전사고 위험에 노출된 어린이 보호구역 교통환경 개선
- 어린이 등하교 보행로 확보로 안전하고 편안한 교통여건 조성

- 위 치: 고흥호형~동일동포~봉래교동(국도15호선)
- 사업기간: 2022. ~ 2028. 【7년】
- 소요예산: 323,100백만원(국비)
- 주요내용: 4차선 확포장 L=23.66km, B=20.0m
- 시 행 청: 국토교통부(익산지방국토관리청)

현재까지 추진상황

- 국토부, 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 예비타당성 대상사업 선정 : '19. 12.
- 기재부(한국조세재정연구원), 일괄 예비타당성 조사 실시 : '20. 1.~12.
 - 기재부 사업 당위성 설명(국토부·전남도·고흥군) : '20. 4.
 - 한국조세재정연구원 현장답사 : '20. 5.
- 국토부, AHP(정책성) 평가자료 작성 및 검토협의 : '20. 7.
- 국토부 및 기재부(한국조세재정연구원) 방문 사업당위성 설명: '20. 8.
- 기재부, 일괄예타 1차 심의('20. 11.) 및 2차 심의('21. 5.)
- 일괄예타, 재정사업 종합평가('21. 7.) 및 대상지 확정 : '21. 8. 24.
 - 고흥~봉래 국도4차선 확포장 예비타당성조사 미통과
 - ※ 영남우두~포두옥강 국도77호선 시설개선 예비타당성조사 통과

문제점 및 대책

- 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 미반영
 - 고흥 우주센터 ~ 광주 고속도로 건설 대선공약 반영 추진
 - 사업규모 : 고속도로 건설 L=96km(4차로), 사업비 : 2조9,000억원

추진계획

- '22년 대선공약 및 고속도로 건설계획에 최우선 반영 건의

예산확보방안

- 최우선 순위 반영 후 국비사업 추진

기대효과

- 나로우주센터 길목, 통행량증가·대형사고 우려로 4차선 확장 필요
- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통에 따른 급증하는 관광객 편익제공

- 대서~도양간 지방도830·851호선⇨국도77호선 노선변경: 119,300백만원
 - 현 노 선(내륙): 대서(탄포)~고흥~도양(52.5km) ⇨ 기존국도
 - 변경노선(해안): 대서(송림)~두원(대전)~도덕(용동)~도양 봉암(46.4km)
- 지방도 확포장 사업 : 3개지구 98,300백만원(도비)
 - 과역 호덕~남양 선정간(지방도843호선): L=9.50km, 452억원(착수)
 - 도양 신흥~도덕 용동간(지방도830호선): L=8.23km, 379억원(보상)
 - 대서 안남~송림간(지방도851호선) : L=3.48km, 152억원(보상)

현재까지 추진상황

- 대서~도양간 지방도 830·851호선을 국도77호선으로 노선변경 건의 : 7회
 - 국토교통부, 국토연구원, 전라남도 방문 지속 건의
- 국토부, 「제2차 국가도로망 종합계획」에 반영 대서~도양간 지방도 830·851호선을 국도77호선으로 노선변경 추진
 - 국도 승격 대상지 제출(전라남도, 국토부) : '19. 7.
 - 한국국토연구원 타당성 검토 용역 : '19. 12.
 - 전남도·고흥군 공조, 국도 승격 필요성 설명 : '20. 3. ~
- 지방도 확포장 사업 조속 추진 건의 : 6회
 - 지방도 확포장사업 설계 완료 3개 지구(착수1, 보상2) 사업 조속 마무리 될 수 있도록 전남도 방문 건의
- 대서~도양 및 고흥~장흥 간 국도77호선 승격 제외 : '21. 5.
- 전라남도 도로건설 관리계획 반영요구 : '21. 8.

문제점 및 대책

- 국토부, 『제2차 국가도로망 종합계획』 국도 승격 제외
 - 전라남도 도로건설 관리계획에 반영 추진
- 전라남도 지방도 설계 완료 후 미발주 사업이 20개소 이상으로 조기 착수가 어려운 실정

추진계획

- 전라남도 도로건설 관리계획에 최우선 반영 건의
- 전라남도에 지방도 확포장 사업 조속 추진 건의

예산확보방안

- '22년 지방도 확포장 사업 5,000백만원(도비) 확보

기대효과

- 서남해안 일주 해안관광도로 전 구간 개통으로 교통량 분산 및 관광자원화

- 위 치: 고흥군 금산면 신양~연흥도
- 사업기간: 2019. ~ 2023. 【5년】
- 소요예산: 19,000백만원(군비)
- 주요내용: 해상인도교 설치 400m

현재까지 추진상황

- 금산 신양~연흥도간 인도교 설치 기본계획 수립 용역 : '19. 4.
- 국토부, 『제2차 국가도로망 종합계획』에 완도~고흥간 지방도830호선을 국도27호선 승격 추진 : '19. 7. ~
 - 국토부 노선 조정계획에 반영하여 국도승격 추진
 - 노선 : 완도고금~금산연흥도~금산신양(해상교량 L= 10.22km / 7,607억원)
 - 전라남도, 예비타당성 면제 대상사업 지속 추진
- 전남도·고흥군 공조 국토부, 한국교통연구원 방문 국도 승격 당위성 설명 : '20. 2. ~
- 국토부, 『제2차 국가도로망 종합계획』 국도승격조사 대상지 선정: '20. 5.
 - 완도 고금~금산, 연흥도~금산 신양 지방도830호선, 국도27호선 승격
- 국토교통부, 기획재정부 협의 : '20. 10. ~ '21. 5.
- 고흥~완도 국도 27호선 승격 발표(국토교통부) : '21. 5. 12.
- 국토부, 노선 변경 고시(일반국도 및 국지도) : '21. 6. 22.

추진계획

- 국회·중앙부처 방문, 고흥~완도간 해상교량 설치 사업 조기시행 건의

예산확보방안

- 국도27호선 해상교량 국비사업 시행

기대효과

- 인도교 건설을 통해 관광객들의 접근성 개선으로 경제 활성화 및 도서주민 정주여건 개선

- 위 치: 고흥군 도화면 지죽리 죽도~목도~지호
- 사업기간: 2020. ~ 2025. 【6년】
- 소요예산: 48,500백만원(도비)
- 주요내용: 교량 0.43km, 접속도로 1.62km
- 시 행 청: 전라남도

현재까지 추진상황

- 도화 지죽~점암 대롱간 지방도855호선 기점변경(도화지호⇨죽도)
전라남도 방문 지속 건의: '20. 2. ~
 - 다도해 절경을 감상할 수 있는 일주도로 개설 해양관광수요 창출
 - 단절된 지역의 간선도로 기능 수행 및 도서민 교통불편 해소
 - 김, 장어 등 지죽도 주 특산물의 원활한 수송을 통해 지역소득 증대
- 전남도 의견, 국도 노선변경(승격 등) 절차 마무리 이후 지방도
건설관리계획에 반영
- 전라남도 도로건설 관리계획 반영요구 : '21. 8.

추진계획

- 지방도855호선 기점변경(도화지호⇨죽도), 전라남도 방문 지속건의

예산확보 방안

- 지방도 기점변경 후 도비사업 시행

기대효과

- 도서지역 연결로 섬 주민 삶의 질 향상 및 해안일주도로 개설로
해양관광 수요 창출
- 김, 장어 등 지죽도 주 특산물의 원활한 수송을 통해 지역소득
기여

- 위 치: 고흥군 대서면 신기~두원면 대전(지방도851호선)
- 사업기간: 2020. ~ 2025. **【6년】**
- 소요예산: 119,300백만원(국비)
- 주요내용: 해상교량 1.73km
- 시 행 청: 전라남도

현재까지 추진상황

- 제2차 국가도로망 종합계획 반영 추진
 - 국도 승격 대상지 제출(전라남도, 국토부): 2019. 7.
 - 한국교통연구원 타당성 검토 용역: 2019. 12.
 - 전남도·고흥군 공조, 국도 승격 필요성 설명: 2020. 3.
- 국토부, 『제2차 국가도로망 종합계획(2021~2030)』 국도승격 대상 노선에 대서~도양 지방도830·851호선 제외 : 2020. 5.
- 전라남도 도로건설 관리계획 반영요구 : '21. 8.

문제점 및 대책

- 국도승격 대상 노선에 대서~도양 지방도830·851호선 제외 : 2020. 5.
 - 전라남도 도로건설 관리계획에 반영 추진

추진계획

- 전라남도 도로건설 관리계획에 반영하여 지방도851호선 대서~두원간 연륙교 개설될 수 있도록 지속 건의

예산확보 방안

- 지방도 도로건설 관리계획에 반영, 도비사업 시행

기대효과

- 서남해안 일주 해안관광도로 개통으로 관광자원화 및 물류비 절감

- 지방도 제2차('14~'23) 위험도로 구조개선 사업: 6개지구 / 12,100백만원
 - 두원 학곡지구(2,000), 도화 봉룡~세동(2,500), 풍양 송정지구(2,800)
 - 점암 강산지구(1,100), 포두 상포지구(2,100), 도양 용정지구(1,600)
- 군도 및 농어촌도로 구조개선 사업: 26개지구 / 12,300백만원
 - 군도: 점암시목(400), 대서안남(300), 도덕대곡(300), 동일대영(200)
 도덕봉덕(300), 과역호덕(400), 도화덕흥(100), 금산청석(900)
 과역송학(800), 대서화산(500), 점암당치(600), 영남금사(1,100)
 과역노일(400), 영남양사(1,200), 과역하분(200)
 - 농도: 금산궁전(200), 두원성두(200), 남양망주(500), 두원신송(300)
 금산우두(100), 두원동신(500), 금산성치(200), 과역백일(500)
 금산신금(1,200), 도양차경(500), 남양 망동(400)

현재까지 추진상황

- 지방도 위험도로, 군도 및 농어촌도로 사업추진
 - 지방도(완료) : 2개지구(두원 학곡, 도화 봉룡~세동)
 - 지방도(추진중) : 3개지구
 - 사업지구 : 도양 용정지구(1,000), 풍양 송정지구(2,640)
 - 실시설계지구: 포두 상포(400)
 - 군도 및 농어촌도로(완료) : 20개지구(점암 시목, 금산 궁전 등)
 - 군도 및 농어촌도로(추진중) : 2개지구(과역 노일, 도양 차경)

추진계획

- 지방도 구조개선 사업 조기 완료될 수 있도록 전남도 지속 방문 건의
- 군도 및 농어촌도로 정비 중장기 계획에 의거 연차적으로 사업추진
 - 영남 양사~남열(1,200), 과역하분(200), 남양 망동(400)

예산확보방안

- '22년 지방도 및 군도·농어촌도로 선형개량 사업비 4,000백만원 (도비 2,200, 군비 1,800) 확보

기대효과

- 위험도로 구조 개선사업 시행으로 교통편익 제공과 사고예방

- 사업기간 : 2020. 11. ~ 2023. 4.
- 소요예산 : 1,062백만원(군비)
- 주요내용 : 군관리계획 타당성 여부 재검토 및 정비
 - 군관리계획 결정(변경), 기초조사, 토지적성평가, 재해취약성분석, 재해영향성검토, 교통·환경·경관성검토, 단계별집행계획 등

현재까지 추진상황

- 계약심사 및 일상감사 : '20. 7.
- 용역발주(PQ) : '20. 9.
- 책임기술인 사업수행능력평가 : '20. 10.
- 용역착수 : '20.11.
- 기초 및 현황조사 분야별 검토 : '20. 11. ~ '21. 11.

추진계획

- 군관리계획 재정비(안) 마련 및 주민공람공고 : '21. 12. ~ '22. 3.
- 관계기관 협의 : '22. 4. ~ '22. 6.
- 군의회 의견청취 : '22. 7.
- 고흥군 군계획위원회 자문 : '22. 9.
- 전라남도 도시계획위원회 심의 : '23. 2.
- 용역준공 : '23. 4.

예산확보방안

- '20년 추경예산(158백만원 확보), '21년 본예산(575백만원 확보)
- '22년 본예산, 329백만원 반영

기대효과

- 용도지역·지구·구역의 합리적인 정비 및 여건변화 반영으로 군민 재산권 보호
- 법령에서 규정하는 각종 도시계획 제도 후속조치 대응

- 사업기간 : 2018. ~ 2022. 【5년】
- 소요예산 : 4,000백만원(국비)
- 주요내용 : 해안탐방로 1.9km(영남 우천 우두~우천마을)

현재까지 추진상황

- '17. 10. : 사업대상지 확정(국토부)
- '18. 09. : 주민설명회 개최
- '20. 02. : 개발계획 변경 승인
 - 지형여건상 남진트롯박물관 연결이 불가능, 탐방로 종점 변경
- '20. 08. : 관련기관 협의(해역이용협의 등)
- '20. 11. : 지역개발사업 구역지정 고시
- '21. 08. : 사업시행자지정 및 실시계획승인 고시
- '21. 11. 08 : 공사착공

추진계획

- '22. 12. : 공사준공

예산확보방안

- 국비 4,000백만원 확보(국토부 지역개발지원사업)

기대효과

- 팔영대교 개통에 따른 고흥을 찾는 관광객에게 해안탐방로를 제공
관광수요에 부응

- 사업기간 : 2020. ~ 2022. 【3년】
- 소요예산 : 11,461백만원(군비)
- 주요내용 : 주차장 16개소 307면(8개소 164면 조성완료)
 - 고흥읍 12개소 245면, 도양읍 4개소 62면

현재까지 추진상황

- 주차장 조성완료(5개소 130면)
 - 고흥읍 유희부지 주차장 조성(2개소 40면) : '20. 04.
 - 고흥공용터미널 건너편 주차장 조성(1개소 67면) : '20. 10.
 - 우회배수로부지 주차장 조성(1개소 7면) : '21. 06.
 - 사계절화원부지 주차장 조성(1개소 16면) : '21. 09.
 - 동촌마을 주차장 조성(2개소 21면) : '21. 11.
 - 동초교정문 주차장 조성(1개소 13면) : '21. 11.

추진계획

- '21. 12. : 공사준공(2개소 42면)
 - 고흥읍 1개소 35면(옥상마을입구)
 - 도양읍 1개소 7면(녹동2구)
- '22. 03. : 공사준공(3개소 51면)
 - 고흥읍 2개소 31면(동부승강장, 해태식당~수협간)
 - 도양읍 1개소 20면(녹동파출소 뒤)
- '22. 06. : 공사준공(3개소 50면)
 - 고흥읍 1개소 15면(고흥여중입구 참기름집)
 - 도양읍 2개소 35면(녹동적벽돌, 신정아파트 맞은편)

예산확보방안

- '21년 본예산 4,450백만원 확보
- '22년 본예산 1,550백만원 반영

기대효과

- 도심지 유희부지를 활용하여 주거밀집지역 및 상가지역의 주차난 해소로 주민편익 제공

- 사업기간 : 2021. ~ 2022. [2년]
- 소요예산 : 860백만원(군비)
- 주요내용 : 공원조성 1개소, 쉼터조성 1개소

현재까지 추진상황

- 고흥 등암 도로변 쉼터조성사업
 - '21. 09. : 실시설계완료
- 도양 사슴골 쌈지소공원 조성사업
 - 공원조성계획안 의견수렴 중

추진계획

- 고흥 등암 도로변 쉼터조성사업
 - '22년 제1회 추경 예산반영(360백만원)
- 도양 사슴골 쌈지소공원 조성사업
 - '22. 01. : 공원조성계획안 확정
 - '22. 02. : 실시설계 완료
 - '22. 03. : 공사발주
 - '22. 09. : 공사준공

예산확보방안

- '21년 본예산 500백만원 확보
- '22년 추경예산 360백만원 반영

기대효과

- 도심지 내 공원 및 쉼터를 조성하여 지역주민 및 관광객에게 쾌적한 휴식공간 제공

- 사업기간: 2021. ~ 2024. 【4년】
- 소요예산: 20,000백만원(국비 7,580, 기금 1,500, 도비 1,250, 군비 9,670)
- 주요내용
 - 고흥군 커뮤니티 라운지 조성 등 4개 거점 조성사업

현재까지 추진상황

- 우리군 뉴딜 사업계획서 국토교통부 제출(도 선정): '20. 8. 12.
- 사업 타당성 및 실현가능성 검증(국토부) 통과: '20. 9. 25.
- 도시재생 뉴딜 사업 최종 확정(국토부): '20. 11. 03.
- 도시재생 활성화 계획 승인·고시: '21. 03. 17.
- 도시재생 실행계획 수립 회의(매주 화요일): '21. 04. 20.~
- 공공건축 사업계획 사전검토 통과: '21. 05. 23.

추진계획

- 건축물 기획 심의: '21. 10.
- 건축물에 대한 설계공모 발주: '21. 11.
- 건축물 실시설계 용역 : '22. 01.
- 교육·운영 프로그램 총괄 발주: '22. 02.
- 단위사업별 시설물 공사 착공: '22. 04.

예산확보방안

- '22년 도시재생 뉴딜사업 9,775백만원(국비 5,865, 도비 977, 군비 2933) 반영

기대효과

- 생활편의와 안정감이 확보된 도시공간 구축
- 원도심 활성화로 지역경제 발전 도모

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 12. 【사업지구: 4년】
- 소요예산: 9,080백만원(국비 6,426 도비 796 군비 1,858)
- 사업량: 5개지구(고흥 신흥, 금산 남천·석정, 과역 상·하분, 동일 신초)
- 주요내용: 생활·위생·기반시설 인프라 개선, 노후불량주택 정비 등

현재까지 추진상황

- '19년도 취약지역 생활여건 개선사업(2019년~2022년)
 - 금산 남천지구 공모 선정: '19. 3. 29.
 - 기본계획 수립 고시: '20. 9. 21.
 - 실시설계 용역 발주: '20. 11. 18.
- '20년 취약지역 생활여건 개선사업(2020년~2023년)
 - 고흥 신흥, 금산 석정, 과역 상하분지구 공모 선정: '20. 3. 3.
 - 3개지구 기본계획 수립 고시: '21. 8. 2.
 - 3개지구 실시설계 용역 발주: '21. 6. 4.~6. 9.
 - 고흥 신흥지구 한국농어촌 고흥지사와 위·수탁 체결: '21. 9.
- '21년 취약지역 생활여건 개선사업(2021년~2024년)
 - 동일 신초지구 공모 선정: '21. 3. 3.
 - 기본계획 수립 용역 발주: '21. 8. 2.

추진계획

- 실시설계 완료 지구 공사 착공: '21. 11. ~
 - 고흥 신흥, 금산 남천·석정, 과역 상하분지구
- 동일 신초지구 기본계획 수립 고시 및 실시설계 용역: '22. 1.~3.

예산확보방안

- '22년 본예산에 2,171백만원(국 1,516 도 197 군 458)반영

기대효과

- 기초생활 인프라 및 노후 불량 주택환경 개선으로 삶의 질 향상
- 위생 및 안전시설의 보강 등의 생활 개선 효과

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 3. 【3년】
- 소요예산: 5,200백만원(국비 2,000, 군비 3,200)
- 주요내용: 도양 구도심 주변 주차환경 개선
 - 주차면수 114대(건축면적 1,058㎡, 연면적 3,502㎡)

현재까지 추진상황

- 구도심 이면도로 주차장 설치 건의: '18. 1. 17.
- 기본계획 및 실시설계 용역: '18. 3. ~ '20. 7.
- 주차환경 개선사업에 반영 국비확보(2,000백만원): '19. 2.
- 주차타워 특정(특허)공법 선정: '20. 2. 12.
- 전라남도 경관·디자인 심의 승인: '20. 5.
- 실시설계에 따른 주민설명회: '20. 6. 2.
- 공사 착공: '20. 12.

추진계획

- 구도심 공용주차장(타워) 조성사업 준공: '22. 3.

예산확보방안

- '22년 본예산에 1,100백만원 반영

기대효과

- 다수의 관광객 방문으로 불법주차, 교통체증 등으로 인한 교통체증 해소 및 쾌적한 도로환경 제공

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2023. 6. **[4년]**
- 소요예산: 11,900백만원(남계어울마당 9,900 공공디자인 2,000)
- 사업량
 - 남계어울마당: 캔틸레버 조성(L=239m)
 - 공공디자인 특화거리: 인도교, 광장, 놀이터 등
- 주요내용: 인도교 및 광장조성 1식

현재까지 추진상황

- 남계어울마당 조성관련 부지확보: '18. 2. ~
 - 편입부지 보상 진행 중(30동 중 27동 완료) ⇨ 건축물 철거, 폐기물 처리
- 남계어울마당 조성관련 내부계획 수립: '18. 12. 28.
 - 공모사업으로 추진 필요 ▶ 전문가/주민 의견 청취
- 공공디자인 특화거리 공모사업 선정: '19. 2. 26.
- 공공디자인 특화거리 조성 관련 주민공청회 실시(3회): '19. 8. 26. ~ 10. 21.
- 남계지구 어울림 조성사업 착공: '20. 3.
- 공공디자인 특화거리 조성 용역 보고회 실시: '20. 5. 18.
- 공공디자인 심의 승인: '21. 3. 09.
- 군계획시설(광장)사업 실시계획 인가 열람 공고: '21. 5. 6.

추진계획

- 남계 어울마당 구간 캔틸레버 준공: '22. 12.
- 공공디자인 특화거리 조성공사 추진: '22. 1. ~ '23. 6.

예산확보방안

- '22년 본예산에 750백만원(도비 225 군비525) 반영

기대효과

- 도시재생뉴딜사업과 연계 추진하여 지역경제 활성화에 기여
- 향후 캔틸레버 하부 주차장 활용 가능(여름철 제외)

- 사업지구 : 해창만 지구
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2023. 3. 【3년】
- 소요예산 : 8,500백만원(국비)
 - 기시행 6,776 ▪ '22년 1,724 ▪ '22년 이후 -
- 주요내용 : 배수갑문 정비(1~3호)
 - 1, 3호 배수갑문 교체, 2호 배수갑문 도장, 구체 단면보수
 - 1, 2, 3호 호이스트 교체, 권양기, 리프트 빔 재도장 등

현재까지 추진상황

- 시행 계획 승인(농림부) : '19. 7.
- 공사 착공 : '20. 4.
 - 구체 보수 1식, 호이스트교체(배수갑문2, 3호), 권양기, 리프트빔 재도장
- 관급자재(배수갑문 1, 3호) 조달청 구매 완료 : '20. 7.
- 배수갑문 1, 3호 교체 완료 : '21. 5.

추진계획

- 2호 배수갑문
 - 재도장(B7.0*H4.8*7련), 호이스트교체, 구체 단면 보수
- 1, 3호 배수갑문
 - 호이스트교체, 구체 단면 보수

예산확보방안

- '22년도 국비 1,724백만원 신청('21년 하반기 예산 내시 예정)

기대효과

- 간척지내 해수 침투 방지 등 농업 재해 예방 도모

- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2022. 6. 【3년】
- 소요예산 : 17,900백만(국비 8,950 도비 1,790 군비 7,160)
 - 풍양 백석 2,862 ▪ 두원 월하 1,560 ▪ 금산 대흥 2,900 ▪ 포두 우산 1,900
 - 도화 단장 1,840 ▪ 과역 심포 1,410 ▪ 남양 해내 2,730 ▪ 대서 송림 2,660
- 주요내용
 - 제방 사석보강 및 그라우팅

현재까지 추진상황

지구	사업비 현황(백만원)				사업내용
	총사업비	기투자	'22년	'22년 이후	
8지구	17,862	1,150	6,066	10,646	
풍양 백석	2,862	850	1,006	1,006	사석보강 L=0.5km
두원 월하	1,560	100	1,460	-	사석보강 L=0.1km
금산 대흥	2,900	100	1,400	1,400	사석보강 L=0.1km
포두 우산	1,900	100	1,800	-	사석보강 L=0.1km
도화 단장	1,840	-	100	1,740	정밀안전진단 용역시행
과역 심포	1,410	-	100	1,310	정밀안전진단 용역시행
남양 해내	2,730	-	100	2,630	정밀안전진단 용역시행
대서 송림	2,660	-	100	2,560	정밀안전진단 용역시행

추진계획

- 풍양 백석 : 사업 준공('22. 6)
 - 그라우팅 992공
- 두원 월하 등 3지구(월하, 대흥, 우산) : 공사 착수('22. 1)
 - 사석보강(L=1.24km)
- 도화 단장 등 4지구(단장, 심포, 해내, 송림) : 설계 용역 착수('22.3.)

예산확보방안

- 8개지구 '22년 국도비 3,640백만원 신청('21년 하반기 예산 내시 예정), 군비부담금 2,426백만원 확보 추진

기대효과

- 간척지내 제방보강을 통한 영농추진 원활 도모

- 사업기간 : 2016. ~ 2022. 【7년】
- 소요예산 : 17,212백만원(국비 1,860, 전환군비 12,038 군비 3,314)
 - 금산 동정 7,412 ▪ 포두 송산 9,800
- 주요내용
 - 동정지구 : 제당 송상 133m, 송수관로 2.0km, 방수로 0.2km
 - 송산지구 : 제당 송상, 이설도로 0.9km, 용수로 9.0km, 여방수로 0.2km

현재까지 추진상황

지구명	사업비 현황(백만원)			사업내용
	총사업비	기투자	'22년	
2지구	17,212	12,258	4,954	
금산 동정	7,412	5,129	2,283	· 제당 125m(H=15m) 방수로 158m 용수로 1.2km, 취수시설 1식
포두 송산	9,800	7,129	2,671	· 방수로 0.2km, 용수로 0.8km 취수시설(복통,사통) 1기

추진계획

- 동정지구 : 제당 125m(H=8m), 그라우팅 62공, 용수관로 0.7km
- 송산지구 : 용수로 3.43km, 송수관로 2.77km

예산확보방안

- 군특 지방(군)이양사업 '22년도 국비 3,468백만원 확정, 군비부담금 1,486백만원 확보 추진

기대효과

- 안정적인 농업용수 공급으로 농업 생산성 향상 도모

- 대상지구 : 받면적이 30ha 이상 우량지구
- 사업기간 : 2019. ~ 2022. 【4년】
- 소요예산 : 3,371백만원(국비 2,696, 도비 300, 군비 375)
 - 금산 신평 2,027 ▪ 점암 사정 1,344
- 주요내용 : 용배수로, 농로포장, 수원공
 - 신평 : 농로 6.5km, 배수로 3.5km, 수원공 1개소
 - 사정 : 농로 7.0km, 배수로 3.0km, 수원공 1개소

현재까지 추진상황

지구명	사업비 현황(백만원)				사업내용	비고
	총사업비	기투자	'22년	'22년 이후		
2지구	3,371	750	1,377	1,244		
금산 신평	2,027	750	1,277	-	· 시행계획 협의 중	계속
점암 사정	1,344	-	1,00	1,244	· '21년 신규 사업 대상지 확정	

추진계획

- 금산 신평지구
 - 기본 및 실시설계 : '21. 1. ~ 9.
 - 시행계획 승인(도) : '21. 10.
 - 공사 착공 : '21. 11.
- 점암 사정지구
 - 기본 및 실시설계 착수 : '22. 01. ~ 06.
 - 시행계획 승인(도) : '22. 07.
 - 공사 착공 : '21. 08.

예산확보방안

- 군특 지방(도)이양사업 '22년도 국도비 1,102백만원 확정,
군비부담금 275백만원 확보 추진

기대효과

- 농업기반 정비사업을 통한 영농 추진 원활 도모

- 사업기간 : 2020 ~ 2024
- 총사업비 : 8,100백만원(국비 4,050, 군비 4,050)
 - 과역 민등제 : 2,200 ▪ 포두 세동제 : 1,000 ▪ 도화 이목동제 : 2,800
 - 도화 지등제 : 2,100
- 주요내용
 - 민등제 : 제당보강 184m, 취수시설 1식, 방수로 75m, 그라우팅 200공
 - 세동제 : 제당 덧쌓기 801m, 그라우팅 312공
 - 이목동제 : 제당보강 115m, 취수시설 1식, 방수로 200m, 그라우팅 116공
 - 지등제 : 제당보강 165m, 취수시설 1식, 방수로 88m, 그라우팅 166공

현재까지 추진상황

지 구 명	사업비 현황(백만원)				사 업 내 용	비 고
	총사업비	기투자	'22년	'23년이후		
4지구	8,100	2,240	1,760	4,100		
민등제	2,200	2,200	-	-	· 제당정비, 취수시설, 방수로, 그라우팅	마무리
세동제	1,000	40	960	-	· 제당 덧쌓기, 그라우팅	계속
이목동제	2,800	-	400	2,400	· '22년 신규 사업 신청	신규
지등제	2,100	-	400	1,700	· '22년 신규 사업 신청	신규

추진계획

- 과역 민등제(사업준공 : '22. 01)
- 포두 세동제
 - 道 사전설계 심의 및 계약 심사 이행 : '21. 08 ~ 11.
 - 사업 착수 : '22. 01.
- 도화 이목동제, 지등제
 - 사업대상지 확정 : '21. 08 ~ 09.
 - 실시설계 착수 : '22. 01 ~ 06.
 - 道 사전설계 심의 및 계약 심사 이행 : '22. 06 ~ 08.
 - 사업 착수 : '22. 09

예산확보방안

- 군비 부담률(50%) 880백만원 '22년 본예산 확보 추진

기대효과

- 저수지 유실 등 재해위험 사전예방 및 안정적인 농업용수 확보

- 사업기간 : 2021 ~ 2024년 **【4년】**
- 소요예산 : 13,600백만원(국비 11,000, 지방비 2,600)
 - 도양 봉서제 900 ▪ 과역 방란제 600 ▪ 대서 금당2제 2,000
 - 과역 가산제 3,000 ▪ 남양 남양제 1,200 ▪ 도화 사동제 2,100
 - 남양 화담제 2,000 ▪ 대서 중남제 900 ▪ 과역 내백제 900
- 주요내용
 - 봉서제 : 제당 107m, 취수시설 1식, 방수로 73m, 그라우팅 78공
 - 방란제 : 제당 78m, 취수시설 1식, 그라우팅 78공
 - 금당2제 : 제당 155m, 취수시설 1식, 여방수로 30m, 그라우팅 156공
 - 가산제 : 제당 145m, 취수시설 1식, 여방수로 35m, 그라우팅 180공
 - 남양제 : 제당 136m, 취수시설 1식, 여방수로 52m, 그라우팅 188공
 - 사동제 : 제당 87m, 취수시설 1식, 여방수로 34m, 그라우팅 121공
 - 화담제 : 제당 145m, 취수시설 1식, 여방수로 75m, 그라우팅 220공
 - 중남제 : 제당 104m, 취수시설 1식, 여방수로 50m, 그라우팅 104공
 - 내백제 : 제당 104m, 취수시설 1식, 여방수로 50m, 그라우팅 104공

현재까지 추진상황

지 구 명	사업비 현황(백만원)				사 업 내 용	비 고
	총사업비	기투자	'22년	'23년이후		
9지구	13,600	600	2,200	10,800		
봉서제	900	400	500	-	· 제당정비, 취수시설, 방수로, 그라우팅	
방란제	600	200	400	-	· 제당정비, 취수시설, 그라우팅	
금당2제	2,000	-	250	1,750	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
가산제	3,000	-	250	2,750	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
남양제	1,200	-	250	950	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
사동제	2,100	-	100	2,000	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
화담제	2,000	-	250	1,750	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
중남제	900	-	100	800	· '22년 신규 사업 대상지 확정	
내백제	900	-	100	800	· '22년 신규 사업 대상지 확정	

추진계획

- 봉서제 등 2개 지구
 - 2차분 사업 착수 : '22. 02.
 - 여방수로 시공 : '22. 03.
 - 그라우팅 시공 : '22. 04.
 - 사업 준공 : '22. 06.
- 금당2제 등 7개 지구
 - 기본 및 실시설계 : '22. 01. ~ 04.
 - 시행계획 승인(도) : '22. 05.
 - 계약심사 이행(도) : '22. 06.
 - 사업 발주 : '22. 07.

예산확보방안

- 군특 지방(도)이양사업 '22년도 도비 1,760백만원 확정
- 군비 부담률(20%) 440백만원 '22년 본예산 확보 추진

기대효과

- 저수지 유실 등 재해위험 사전예방 및 안정적인 농업

- 사업기간 : 1995. ~ 2025. 【31년】
- 사업대상 : 경지정리 117지구, 625개 노선(688km)
- 총사업비 : 70,311백만원(국비 49,218, 도비 6,328, 군비 14,765)
 - '20년까지 : 46,490 ▪ '21년 : 300 ▪ '21년 이후 : 23,521
- 주요내용 : 기계화경작로 포장 688km(포장율 67%)
 - '19년까지 : 453.62km, ▪ '21년 : 2.75km ▪ '22년 이후 : 231.63km

현재까지 추진상황

구분	지구명	사업비 (백만원)	추진계획	비고
계	12지구	300	L=2.75km	
군	도양 대봉	60	L=0.60km	
군	풍양 당두	15	L=0.13km	
군	도덕 신양	30	L=0.29km	
군	도덕 당중	13	L=0.12km	
군	도화 구암	14	L=0.04km	
군	점암 강산	17	L=0.16km	
군	점암 한산1	32	L=0.31km	
군	점암 다리목	30	L=0.28km	
군	점암 한산2	22	L=0.21km	
군	과역 도야	26	L=0.21km	
군	남양 와야	17	L=0.16km	
군	남양 노송	24	L=0.24km	

추진계획

- 포두면 등 13개지구 시행계획 신청 및 승인 : '22. 02
- 실시설계 완료 및 공사 착수 : '22. 03
 - 영농기철 이전 조기 착수
- 공사 준공 : '22. 05

예산확보방안

- '21년 하반기 예산 확정 내시
- 군비 부담률(21%) 63백만원 '22년 본예산 반영

기대효과

- 농어촌 영농환경개선 및 농업 기계화 촉진과 농업 경쟁력 제고 기여

- 사업기간 : 1990. ~ 2025. 【36년】
- 사업대상 : 경지정리 117지구(447.06km)
- 총사업비 : 42,471백만원(국비 33,977, 군비 8,494)
 - '20년까지 : 17,804 ▪ '21년 : 375 ▪ '21년 이후 : 24,292
- 주요내용 : 흙수로 구조물화 447.06km 정비(정비율 58%)
 - '20년까지 : 182.28km, ▪ '21년 : 2.10km ▪ '22년 이후 : 262.68km

현재까지 추진상황

지구명	사업비	사업비(백만원)		추진계획	비고
		도비	군비		
12지구	375	300	75	L=2.10km	
도양 대봉	35	28	7	흙수로 구조물화 L=0.27km	
풍양 봉양	31	25	6	흙수로 구조물화 L=0.23km	
금산 신흥	30	24	6	흙수로 구조물화 L=0.04km	
도화 구암	51	41	10	흙수로 구조물화 L=0.29km	
도화 성두	35	28	7	흙수로 구조물화 L=0.07km	
포두 신촌	26	21	5	흙수로 구조물화 L=0.22km	
점암 청남	33	26	7	흙수로 구조물화 L=0.08km	
점암 신흥	30	24	6	흙수로 구조물화 L=0.20km	
과역 도야	33	26	7	흙수로 구조물화 L=0.10km	
두원 영동	41	33	8	흙수로 구조물화 L=0.40km	
두원 학곡1	10	8	2	흙수로 구조물화 L=0.10km	
두원 학곡2	20	16	4	흙수로 구조물화 L=0.10km	

추진계획

- 도양읍 등 13개지구 시행계획 신청 및 승인 : '22. 02
- 실시설계 완료 및 공사 착수 : '22. 03
 - 영농기철 이전 조기 착수
- 공사 준공 : '22. 05

예산확보방안

- '21년 하반기 예산 확정 내시
- 군비 부담률(20%) 75백만원 '22년 본예산 반영

기대효과

- 용수 및 배수 불량 구간 구조물화로 농경지 침수피해 예방 및 안전영농 기여

- 위 치: 영남면 우천리 산1-1 일원
- 사업기간: 2019. ~ 2022. 【4년】
- 소요예산: 9,100백만원(국비 4,300, 도비 800, 군비 4,000)
- 주요내용: A=19,060m²(진입도로, 주차장, 특산품판매장, 편의시설 등)
- 시 행 청: 순천국토관리사무소, 고흥군

□ 현재까지 추진상황

- 국토부, 익산청 방문 쉼터 조성 건의 : '19. 4.
- 쉼터 조성부지 매입 : '19. 11.
- 국토부, 스마트 복합쉼터 공모사업 선정 : '20. 5.
- 업무협약(MOU) 체결(순천국토 ↔ 고흥군) : '20. 6.
 - (순천국토) 기반시설에 대한 실시설계 및 시공
 - (고 흥 군) 기반시설 外 건축(편의시설 등)과 스마트시설 등에 대한 실시설계 및 시공과 복합쉼터 전반 유지·관리
- 기반시설 실시설계 완료(순천국토, 기반조성) : '20. 8. ~ 12.
- 건축실시설계 완료(고흥군) : '21. 1. ~ 11.
- 기반조성 공사 착공(순천국토) : '21. 2.
- 건축공사 신청 : '21. 12.

□ 추진계획

- 수소충전소구축사업 시행: '21. 11. ~ '22. 6.
- 건축공사 시행: '22. 1. ~ '22. 6.
- 기반조성공사 완료 : '22. 4.

□ 예산확보방안

- '22년 쉼터조성 시설비 4,850백만원 확보(국비 1,350 도비 450, 군비 3,050)

□ 기대효과

- 팔영대교 개통으로 방문객 급증에 따른 관광객 편의 제공
- 여수~고흥간 해상교량의 우수한 경관 및 스토리가 있는 힐링공간 제공과 지역 농특산물 판매를 통한 소득창출

- 위 치: 고흥읍 남계리 봉계교차로
- 사업기간: 2019. ~ 2023. 【5년】
- 소요예산: 6,760백만원(국비)
- 주요내용: 교차로개선 1식
- 시 행 청: 국토교통부(순천국토관리사무소)

현재까지 추진상황

- 기본계획 수립 용역 완료(순천국토) : '19. 10.
- 진입부 교통안전시설물 설치 : '20. 2.
- 주민건의사항 진달(순천국토-광주, 광양 고가도로 건설) : '20. 6.
- 기본 및 실시설계 용역(순천국토) : '19. 12. ~ '20. 9.
- 편입토지 및 지장물 보상시행 : '20. 9. ~ 12.
- 사업착공 : '20. 11. ~ '23. 11.
 - 사업기간 교차로 교통처리 대책 수립 및 사업조기 완료('22. 12.) 건의

문제점 및 대책

- 교통통제('21. 3. ~ '23. 11.)기간 장기화에 따른 도로이용객 불편초래
 - 시행청(순천국토)에 사업 조기완료 요청 및 잔여사업비(국비 45.6억원) 확보 최선

추진계획

- 사업 조기완료 및 잔여사업비 지원 지속건의
- 사업 조기 준공: '22. 12.

기대효과

- 봉계회전교차로 개선으로 도로환경 개선 및 교통사고 예방

- 위 치: 남양면 중산리 일원
- 사업기간: 2019. ~ 2022. 【4년】
- 소요예산: 10,300백만원(특교세 1,000 군비 9,300)
- 주요내용: 인도교설치 L=1,320m, B=2.0m

현재까지 추진상황

- 기본 및 타당성조사 용역 : '19. 1. ~ 9.
- 주민 간담회 개최(1차) : '19. 7. ~ 8.
- 어업권 피해보상 사전조사 용역 : '19. 11. ~ '20. 2.
- 주민 간담회 개최(2차) : '20. 3.
 - 사업 어업피해 조사 용역 결과 및 추진계획 설명
- 실시설계 용역 시행 : '21. 1. ~ '21. 11.
- 주민설명회 개최 : '21. 7.
- 교량 특허공법 선정 : '21. 8. ~ 9.
- 사업발주 : '21. 12.

추진계획

- 사업준공 : '22. 12.

예산확보방안

- '22년 연도교 설치 사업비 3,000백만원(군비) 확보

기대효과

- '가족의 섬'인 우도의 접근성 개선으로 관광객 유입 및 도서주민 생활불편 해소

35**[계속] 군도 및 농어촌도로사업 체계적 추진**

- 군도 정비사업: 26개노선 268.8km
 - 포장: 247.2km(92.0%) ⇨ 미포장 21.6km(8%)
- 농어촌도로 정비사업: 343개노선 789.0km
 - 포장: 288.5km(36.6%) ⇨ 미포장 500.5km(63.4%)

□ 추진계획 : 109지구 8,207백만원(군비)


- 군도정비 : 21지구 2,090백만원
- 농어촌도로 정비 : 88지구 6,117백만원

□ 앞으로 추진계획

- 실시설계: '22. 1. ~ 2.
- 사업시행: '22. 3. ~ 12.
- 군도 및 농어촌도로 정비 중장기 계획에 의거 연차적으로 사업 추진

36**[기존] 지역 건설업체 역량 강화****□ 세부추진계획**

- 건설업체 관계자 직무교육
 - 일시/장소: '22. 11. / 고흥군청 우주홀
 - 강사: 대한전문건설협회 전문강사
 - 주요내용: 건설업 등록기준, 건설산업기본법 위반사례 등
- 건설업체 실태조사: '22. 6. 1. ~ 12. 31.
 - 조사대상: 196개 업체
 - 조사방법 및 일정



- 조사팀: 건설행정팀장 외 1명
- 소요예산: 5백만원
- 건설업 등록기준 미달업체 행정처분: 수시

- 사업기간: 2022. 2. ~ 2022. 10.
- 소요예산: 300백만원(군비)
- 주요내용
 - 경지정리 외 지구 협소한 농로 교차로 및 마을 안길 가각부 정비(45개 지구)

□ 현재까지 추진상황

- '21년 사업대상지구 전수 조사 : '21. 3. ~ 5.
 - 마을 안길 및 경지정리 외 지구 37개소 대상지 선정
- '21년 사업대상지구 사업추진 : '21. 5. ~ 11.
 - 사업량: 16개 읍·면, 37개 지구
 - 사업비: 300백만원

□ 앞으로 추진계획

- '22년 사업대상지 전수조사: '21. 12. ~ '22. 2.
- 실시설계 용역: '22. 1. ~ 4.
- 사업 추진: '22. 3. ~ 10.
- 사업 예시



[기존] 마을 쉼터 유지 보수사업 추진

- 사업기간: 2022. 2. ~ 2022. 7.
- 사업량 및 소요예산: 50개소 / 200백만원(군비)
- 주요내용
 - 마을쉼터(퍼걸러, 한식 정자 등) 전수조사를 실시, 기능유지 및 내구 연한 증대위한 보수사업 추진

현재까지 추진 사항

- '21년 사업지구 16개 읍·면 쉼터 전수조사: '20. 12. ~ '21. 2.
- '21년 사업 대상지구 49개소 선정
- '21년 사업 대상지구 쉼터 유지 보수 추진: '22. 2. ~ '21. 10.

앞으로 추진계획

- '22년 사업대상지 전수조사: '21. 12. ~ '22. 2.
- 실시설계 용역: '22. 1. ~ 4.
- 사업 추진: '22. 3. ~ 10.

[기존] 소규모 지역개발사업 추진

세부추진계획

- 대상사업: 농로, 배수로, 마을 진입로 및 안길, 공동 이용시설, 소규모 편익시설 등
- 대상개요: 935건 / 21,091백만원
- 세부 추진 사항
 - '22년도 사업대상지구 선정 및 예산 반영: '21. 11. ~ 12.
 - 현지조사 및 실시설계: '22. 1. ~ 3.
 - 공사 발주 및 착공: '22. 3. ~ 5.
 - 공사 준공: '22. 4. ~ 6.

- 위 치: 영남면 우천리~포두면 옥강리(국도77호선)
- 사업기간: 2021. ~ 2027. 【7년】
- 소요예산: 69,100백만원(국비)
- 주요내용: 도로시설개선 L=14.0km
- 시 행 청 국토교통부(익산지방국토관리청)

현재까지 추진상황

- 국토부, 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 예비타당성 대상사업 선정 : '19. 12.
- 기재부(한국조세재정연구원), 일괄 예비타당성 조사 실시 : '20. 1.~12.
 - 기재부 사업 당위성 설명(국토부·전남도·고흥군) : '20. 4.
 - 한국조세재정연구원 현장답사 : '20. 5.
- 국토부, AHP(정책성) 평가자료 작성 및 검토협의 : '20. 7.
- 국토부 및 기재부(한국조세재정연구원) 방문 사업당위성 설명: '20. 8.
- 기재부, 일괄예타 1차 심의('20. 11.) 및 2차 심의('21. 5.)
- 일괄예타, 재정사업 종합평가 실시 : '21. 7. 5.
- 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 대상지 확정 : '21. 8. 24.
- 국토부, 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 최종 확정 : '21. 9. 28.

추진계획

- 사업 조기시행을 위하여 국회 및 중앙부처 방문 지속 건의

예산확보방안

- 『제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획』 반영으로 국비사업 추진

기대효과

- 기존 노선 굴곡 및 선형불량에 따른 안전사고 예방을 위해 개선필요
- 여수~고흥간 연륙·연도교 개통에 따른 급증하는 관광객 편의제공

- 위 치: 다중이용 버스승강장
- 사업기간: 2019. ~ 2022. 【4년】
- 소요예산: 300백만원(군비)
- 주요내용: 온열의자 및 바람막이 설치

현재까지 추진상황

- 다중이용 버스승강장 혹한기대비 시설 설치
 - 온열의자 28개소, 바람막이 35개소(200백만원)

앞으로 추진계획

- 다중이용 버스승강장 혹한기대비 시설 설치
- 대상지 선정 및 사업시행: '22. 1. ~ 11.
 - ※ 온열의자 및 바람막이 설치 50개소(100백만원)

2022 재 정 투 자 계 획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	기투자	2022년 소요예산					2023년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (용자담)		
합 계	1,207,712	204,164	92,895	21,227	12,978	58,690	-	910,613	
신규시책	14,950	150	3,010	100	160	2,750	-	11,790	
•보행자 안전구역 설 치 사 업	200	-	200	-	-	200	-	-	
•드론특화 지식산업센터 진 입 로 개 선	5,800	150	2,000	-	-	2,000	-	3,650	
•배수 개선 사업	5,900	-	100	100	-	-	-	5,800	
•소규모 배수개선 사 업	1,000	-	100	-	80	20	-	900	
•대구획 경지정리 (포 두 남 성)	1,540	-	100	-	80	20	-	1,440	
•염분농도 자동 계 측 기 설 치	510	-	510	-	-	510	-	-	
공약사항	765,169	29,367	12,142	1,560	7,200	3,382	-	723,660	
•어린이 놀이터 확대 및 개보수 지원	4,300	1,348	2,642	1,560	-	1,082	-	310	
•고흥터미널 주변 공영주차장 조성	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
•어린이 등하교 보행로 확보 및 스쿨존 확대	3,969	3,469	500	-	-	500	-	-	
•고 흥 ~ 봉 래 국도4차선 확포장	323,100	-	-	-	-	-	-	323,100	
•고흥일주 해안도로 전 구간 개통	217,600	6,000	5,000	-	5,000	-	-	206,600	
•금산 신양~연흥간 인도교 개설	19,000	50	-	-	-	-	-	18,950	
•도화 지호 ~ 죽도 연도교 개설	48,500	-	-	-	-	-	-	48,500	
•대 서 ~ 두 원 연륙교 개설	119,300	-	-	-	-	-	-	119,300	
•도로 선형개량	24,400	13,500	4,000	-	2,200	1,800	-	6,900	

사 업 명	총사업비	기투자	2022년 소요예산					2023년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (용자담)		
계속사업	336,597	174,447	56,037	19,557	5,618	30,862	-	106,073	
• 고흥 군관리계획 (재정비) 수립	1,062	733	329	-	-	329	-	-	
• 고흥~거제간 남해안 쪽빛너울길 연결도로 개설	4,000	3,371	629	629	-	-	-	-	
• 유희부지 주차장 조성사업 추진	11,461	9,911	1,550	-	-	1,550	-	-	
• 공원등 주민편의 시설 조성	900	500	360	-	-	360	-	-	
• 도시재생 뉴딜 사업 공모	20,000	2,767	9,775	5,865	977	2,933	-	7,458	
• 취약지역 생활여건 개선 사업	9,080	4,502	2,171	1,516	197	458	-	2407	
• 도양 구도심 공용 주차장 조성	5,200	4,100	1,100	-	-	1,100	-	-	
• 남계어울마당 및 공디자인 특화거리 조성사업	11,900	10,650	750	-	225	525	-	500	
• 국가관리 방조제 개 보수	8,500	6,776	1,724	1,724	-	-	-	-	
• 지방관리 방조제 개 보수	17,862	1,150	6,066	3,033	607	2426	-	10,646	
• 지표수 보강 개발 사업	17,212	12,258	4,954	-	-	4,954	-	-	
• 발기반 정비사업	3,371	750	1,377	-	1,102	275	-	1,244	
• 재해위험저수지 정비 사업	8,100	2,240	1,760	880	-	880	-	4,100	
• 시군관리 수리시설 개 보수 사업	13,600	600	2,200	-	1,760	440	-	10,800	
• 기계화경작로 확포장 사업	70,311	46,790	300	-	-	300	-	23,221	
• 흙수로 구조물화 사업	42,471	18,179	375	-	300	75	-	23,917	
• 팔영대교 스마트 복합쉼터 조성	9,100	4,250	4,850	1,350	450	3,050	-	-	
• 고흥 봉계교차로 개선 사업	6,760	2,200	4,560	4,560	-	-	-	-	
• 남양~우도간 인도교 설치	10,300	2,120	3,000	-	-	3,000	-	5,180	
• 군도 및 농어촌도로사업 체계적 추진	65,407	40,600	8,207	-	-	8,207	-	16,600	

사업명	총사업비	기투자	2022년 소요예산					2023년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (융자금)		
기존시책	90,996	200	21,706	10	-	21,696	-	69,090	
•지역건설업체 역량강화	5	-	5	-	-	5	-		
•마을안길및농로 가각부정비	300	-	300	-	-	300	-	-	
•마을쉼터유지 보수사업	200	-	200	-	-	200	-	-	
•소규모 지역개발 사업추진	21,091	-	21,091	-	-	21,091	-	-	
•영남 우두~포두 옥강 국도77호선 시설개선	69,100	-	10	10	-	-	-	69,090	
•혹한기 대비 버스승장장 시설개선 확대	300	200	100	-	-	100	-	-	
